

HARMONOGRAM STAVBY: 8.4.2026 – 31.10.2026

Obnova podkladních vrstev silnice I/67 bude provedeny vždy v pracovním úseku stavby v rámci částečné uzavírky. Obnova obrusných vrstev silnice I/67 (finišer) – viz. uvedené etapy níže.

Obnova povrchů místních komunikací a veřejně přístupných účelových do 06/2027

8.4. - 9.4.2026 Frézování obrusné vrstvy jeden jízdní pruh – pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné

Úsek od nemovitosti č. 224 po nemovitost č. 45 (křižovatka sil. I/67 x MK7c)

Doprava bude řízena pomocí regulovčků.

Termín: 10.4. – 14.4.2026

DDZ etapa 10

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK7c, parc. č. 100

Popis prací

Uložení gravitační stoky A, úsek Š9 – Š1 u č. 45 v délce 22m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem

Dopravní řešení

Uzavírka MK7c u č. 45 (hasiči) od křižovatky se sil. I/67. Délka uzavřeného úseku 25m.

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu směr Bohumín v délce 12m, průjezd zachován.

Bez navržené objízdné trasy

Termín: 15.4. – 21.4.2026

DDZ etapa 8

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK 59c parc. č. 397/2, MK3d parc. č. 4927/2

Popis prací

Uložení gravitační stoky A, úsek Š1 – Š3 vč. přípojky od č. 1148 po č. 1115 v délce 50m.

Uložení gravitační stoky A-1 včetně přípojek v MK59c v délce 57m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od č. 1148 po č.p. 137. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově trojramenným SSZ (křižovatka sil. I/67 x MK1a).

Uzavírka MK59c od křižovatky se sil. I/67 po č.p. 288. Délka uzavřeného úseku 60m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK7c na parc. č. 100.

Objízdná trasa – IP22 uzavírka MK59c

Termín: 22.4. – 25.4.2026

DDZ etapa 9

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, u křižovatky I/67 x MK1a

Popis prací

Příčné uložení části gravitační kanalizační přípojky 237 u č. 29, délka 5m

Práce budou provedeny otevřeným výkopem

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu směr Bohumín u č.p. 29 v délce 12m, průjezd zachován

Termín: 26.4. - 6.5.2026

DDZ etapa 7

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2

Popis prací

Uložení gravitační stoky A, úsek Š3 – Š5 vč. přípojek od č. 1148 po č. 137 v délce 50m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení křižovatky v jízdním pruhu – směr Karviná v úseku od č. 1148 po č. 137. Průjezd křižovatkou sil. I/67 x MK1a zachován.

Uzavírka odbočení ze silnice I/67 do M59c.

Uzavírka odbočení ze silnice I/67 do MK7c.

Objízdná trasa – IP22 uzavírka MK59c

Termín: 7.5. - 21.5.2026**DDZ etapa 5****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2****Popis prací**

Uložení gravitační stoky A, úsek Š5 – Š10 vč. přípojek, propoje stoky A-2 a provedení části odbočky stoky A-3, od č. 137 po č. 364 v délce 140m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od č. 137 po č. 364.

Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 150m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK3b.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK54c.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 k obecnímu úřadu.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- veřejně přístupná účelová komunikace na parc. 457/4, 457/2 – MK25c, délka objízdné trasy 500m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka „Dětmarovice, obecní úřad“ směr Karviná mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 22.5. - 29.5.2026**DDZ etapa 6****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3b parc. č. 52/2, MK4d parc. č. 4927/4****Popis prací**

Přepojení přípojek 202, 204, 208 a odbočky zbývající část propoj stoky A-3, úsek od č. 137 po č. 364

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Bohumín v úseku od č. 137 po č. 364. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 150m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK3b.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK54c.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 k obecnímu úřadu.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK3b – veřejná přístupná účelová komunikace na parc. č. 40 – MK4c, délka objízdné trasy 540m

Silnice I/67 – MK54c –MK26c, délka objízdné trasy 380m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka (směr Bohumín) mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 30.5. - 25.6.2026**DDZ etapa 3****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2****Popis prací**

Uložení gravitační stoky A, úsek Š10 – Š17 vč. přípojek a odboček stok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 od č. 364 po křižovatku sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům) v délce 285m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od č. 364 po křižovatku sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům). Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 290m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK3b u COOP

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 457/4.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK4c

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK3b – veřejná přístupná účelová komunikace na parc. č. 40 – MK4c, délka objízdné trasy 540m

Silnice I/67 – MK54c –MK26c, délka objízdné trasy 380m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka (směr Bohumín) mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 26.6. - 4.7.2026

DDZ etapa 4

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK4d parc. č. 4927/4, 4927/5, 4927/6, MK3b + MK6d parc. č. 52/2, MK4c parc. č. 4394/4,

Popis prací

Uložení částí propojů gravitačních stok vč. přípojek, a to A-4 v délce 35m, A-5 propoj, A-7 v délce 47m, A-8 v délce 45m. Lokalita - úsek cca od č. 364 po křižovatku sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům). Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Bohumín v úseku od č. 364 po č. 110 (Dělnický dům). Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 290m.

Uzavírka MK3b u COOP v délce 40m.

Uzavírka MK4c v délce 50m

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 457/4.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK3b – veřejná přístupná účelová komunikace na parc. č. 40 – MK4c, délka objízdné trasy 540m

Silnice I/67 – MK54c – MK26c, délka objízdné trasy 380m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka (směr Bohumín) mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 5.7. - 31.7.2026

DDZ etapa 1

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2, 4927/3

Popis prací

Uložení gravitační stoky A, úsek Š17 – Š27 vč. přípojek a odboček stok A-9, A-10 (propoj), A-11, A-12 od křižovatky sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům) po č.p. 15 v délce 265m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od křižovatky sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům) po č. 15. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 280m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Uzavírka odbočení k Dělnickému domu

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK10b

V této etapě stavby bude dočasně vypnuto SSZ přechodu chodců u parkoviště dům lékařů č. 900.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK10b, délka objízdné trasy 450m

Veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 457/4 – MK26c - MK29c – MK28c, délka objízdné trasy 790m

Termín: 1.8. - 13.8.2026

DDZ etapa 2

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK4d parc. č. 4927/6

Popis prací

Uložení částí gravitačních kanalizačních přípojek a odboček stok A-11, A-12. Lokalita úseku od č. 22 po č. 224, délka úseku cca 310m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Bohumín v úseku č. 22 po č. 224. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 310m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Uzavírka odbočení k Dělnickému domu

Uzavírka odbočení parkoviště u domu lékařů č. 900

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK10b

V této etapě stavby bude dočasně vypnuto SSZ přechodu chodců u parkoviště dům lékařů č. 900.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK10b, délka objízdné trasy 450m

Veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 457/4 – MK26c - MK29c – MK28c, délka objízdné trasy 790m

Provedení obnovy obrusné vrstvy silnice I/67: 14.8.2026 – 15.8.2026, 17.8.2026

v úseku pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné, od nemovitosti č. 224 po nemovitost č. 45 (křižovatka sil. I/67 x MK7c). Pro asfaltaci budou použity stejné návrhy DDZ, které byly použity pro provedení výkopových prací.

14.8.2026 DDZ etapa č. 8

15.8.2026 DDZ etapa č. 3

17.8.2026 DDZ etapa č. 1

18.8.– 19.8.2026 Frézování obrusné vrstvy jeden jízdní pruh – pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné

Úsek od nemovitosti č. 1084 po nemovitost č. 98

Doprava bude řízena pomocí regulovčků.

Termín: 20.8. - 24.8.2026**DDZ etapa 11**

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK10c, parc. č. 118

Popis prací

Uložení gravitační stoky A-15, úsek DP-03 – část po Š204 v délce 20m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem

Dopravní řešení

Uzavírka MK10c u č. 31 od křižovatky se sil. I/67 po č. 1108. Délka uzavřeného úseku 15m.

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu směr Bohumín v délce 12m, průjezd zachován..

Bez navržené objízdny trasy

Termín: 25.8. - 13.9.2026**DDZ etapa 12**

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK7d parc. č. 4928

Popis prací

Uložení gravitační stoky A-15, úsek Š204 – Š207 (propoj na Š208), stoka US4, stoka A-15-1-1 (propoj), uložení přípojky 239 - otevřeným výkopem.

Uložení výtlačné kanalizace stoka B-5 úsek od Š-U4 po odbočku přípojka 274. Bezvýkopově – protlakem – otevřeným výkopem budou provedeny montážní jámy protlaku (startovací – cílová), montážní jámy pro provedení propojení přípojek, jámy pro ověření umístění stávajících inženýrských sítí.

Úsek od č. 258 po č. 843. Délka úseku 330m

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku č. 258 po č. 843.

Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 335m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK10c

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK24c

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 186/1

Bez navržené objízdny trasy

Termín: 14.9. - 4.10.2026

DDZ etapa 13

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK7d parc. č. 4928

Popis prací

Uložení výtlačné kanalizace stoka B-5 úsek vč. přípojek od odbočky přípojka 274 po přípojku 291. Bezvýkopově – protlakem – otevřeným výkopem budou provedeny montážní jámy protlaku (startovací – cílová), montážní jámy pro provedení propojení přípojek, jámy pro ověření umístění stávajících inženýrských sítí.

Úsek od č. 843 po č. 1385. Délka úseku 310m

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku č. 843 po č. 1385. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 320m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK13c (p.č. 248, 251)

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 267, uzavírka VÚK v délce 30m – uložení KP 219, 288.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 284

Navržená objízdná trasa

MK25c – MK9b – MK54c, délka objízdné trasy 1,7 km

MK7c – MK11c – MK13c, délka objízdné trasy 980m

Termín: 5.10. - 25.10.2026

DDZ etapa 14

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK8d parc. č. 4927/8

Popis prací

Uložení výtlačné kanalizace stoka B-5 vč. přípojek, úsek od odbočky přípojka 291 po přípojku 301. Bezvýkopově – protlakem – otevřeným výkopem budou provedeny montážní jámy protlaku (startovací – cílová), montážní jámy pro provedení propojení přípojek, jámy pro ověření umístění stávajících inženýrských sítí.

Úsek od č. 1385 po č. 98. Délka úseku 186m

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku č. 1385 po č. 98. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 190m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK8b

Navržená objízdná trasa

MK8b – MK27c – MK9b – MK25c – MK58c – veřejná účelová komunikace parc. č. 279, 284, délka objízdné trasy 2,9km

Provedení obnovy obrusné vrstvy silnice I/67: 26.10.2026 – 31.10.2026


v úseku pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné, od nemovitosti č. 1084 po nemovitost č. 98
Pro asfaltaci budou použity stejné návrhy DDZ, které byly použity pro provedení výkopových prací.

26.10. - 27.10.2026 DDZ etapa č. 12

28.10. - 29.10.2026 DDZ etapa č. 13

30.10. - 31.10.2026 DDZ etapa č. 14

Po dobu pracovní směny bude vlastníkům nemovitostí umožněn přístup k nemovitostem a dále bude umožněn vjezd do uzavřeného úseku složkám IZS.




Etapa 1.

-  umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladoš




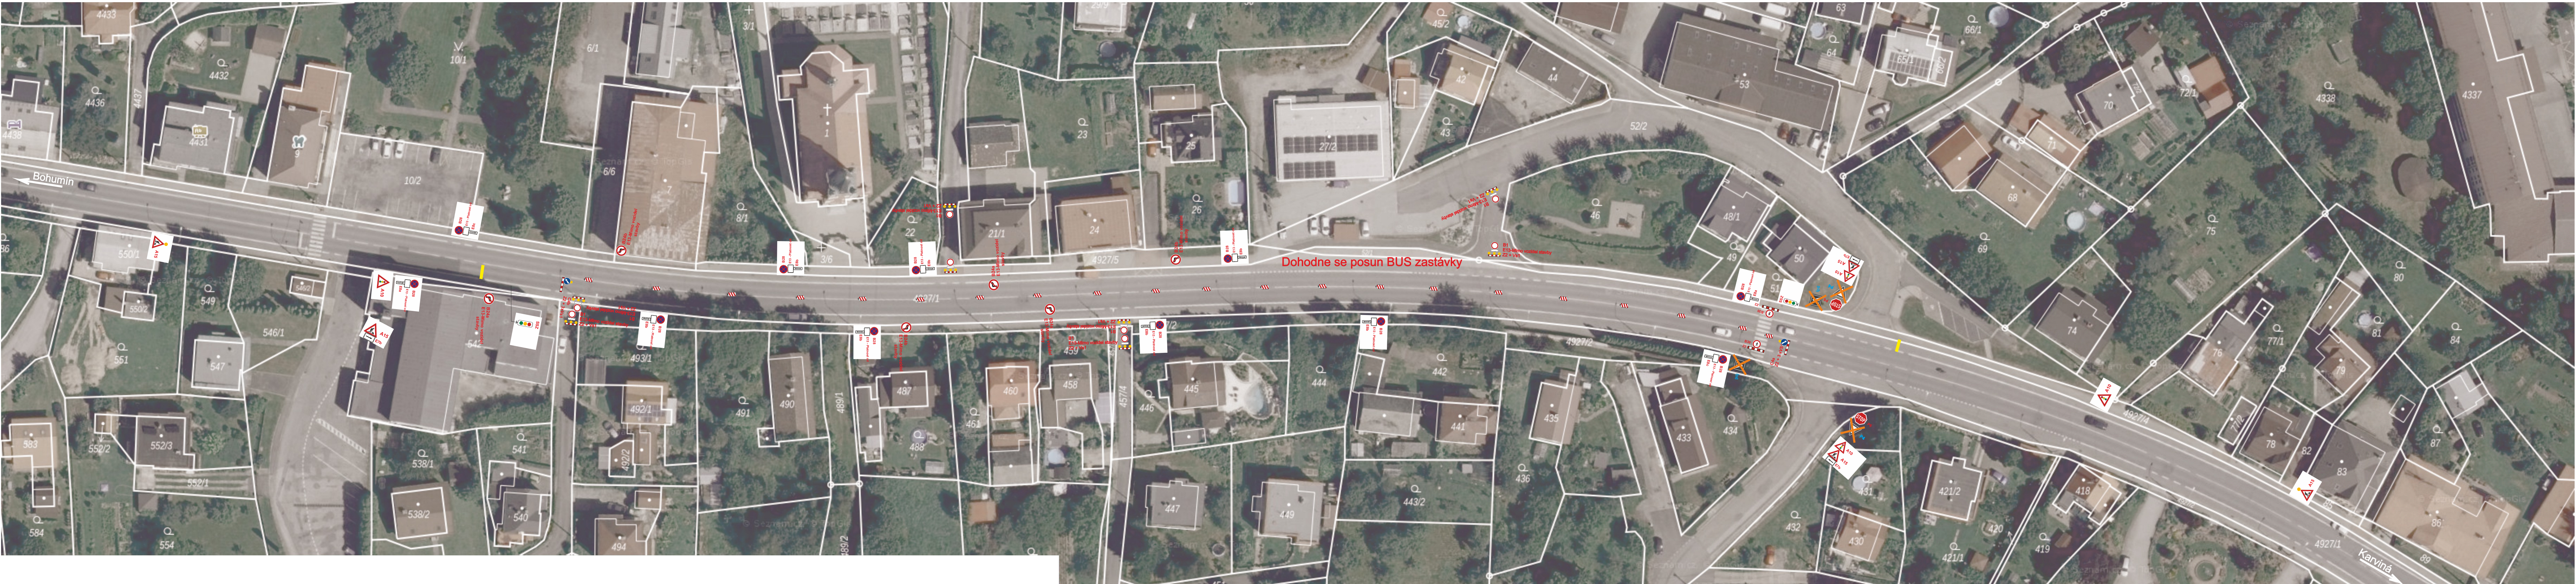

Etapa 3.

-  B28 umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  E13 - Přemístění od
-  P6 stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  B20a přechodné DZ



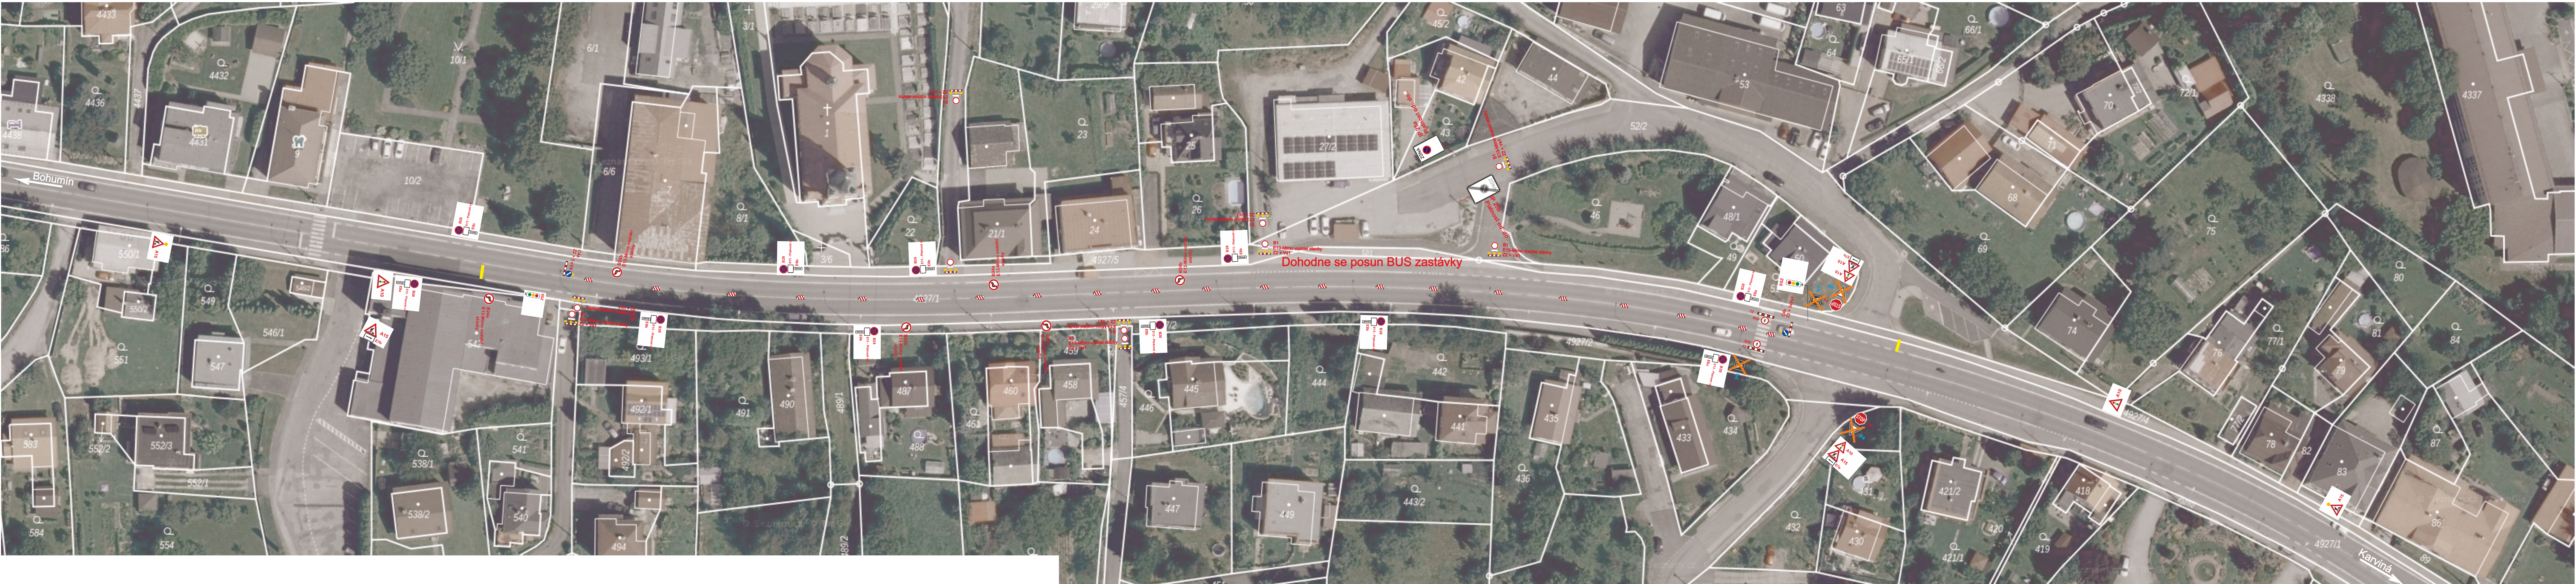


Etapa 4.

-  umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vlasák



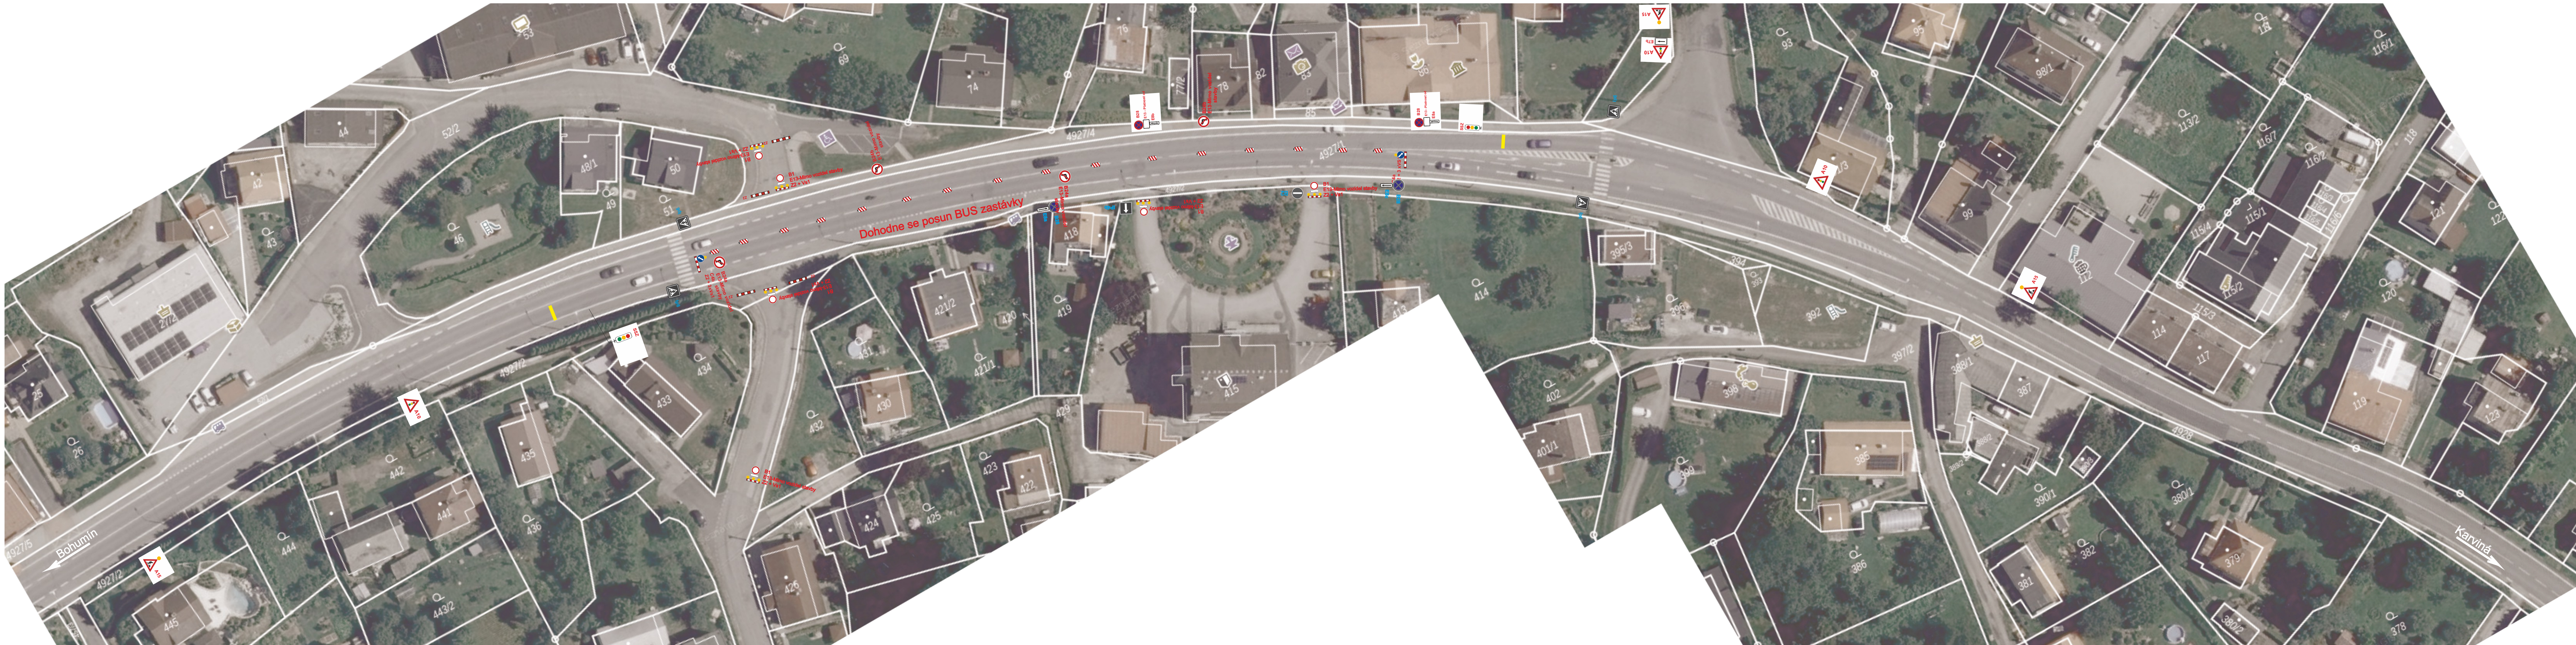

Etapa 5.

-  B28 umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  E13 - Platnost od
-  P6 stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  B20a přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladoř






Etapa 6.

-  B20 umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  P6 stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  B20a přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah: Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladoš



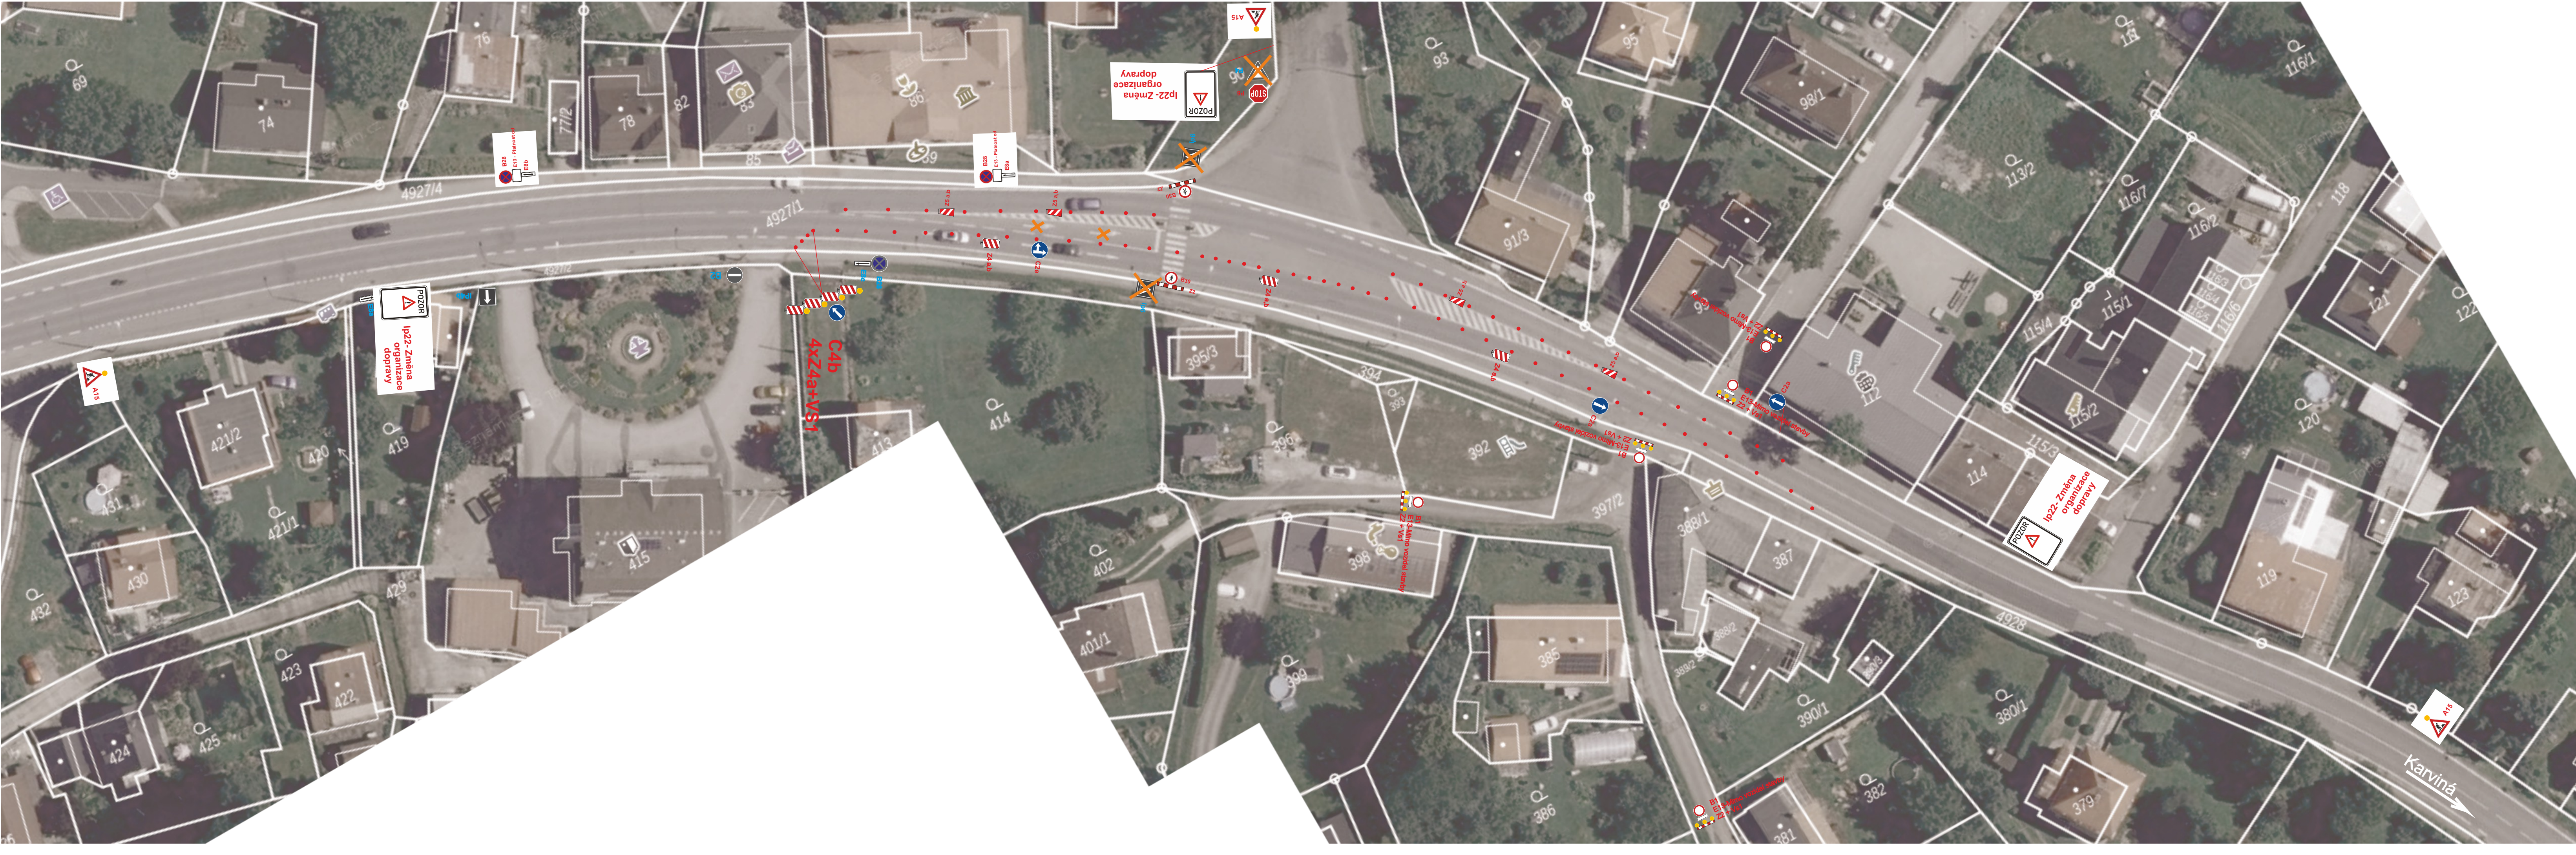


Etapu 7.

- B20a - umístí se 7 dnů před zahájením akce
- B20b - stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
- B20c - přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmorovice (střed)
K. ú. Dětmorovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladar



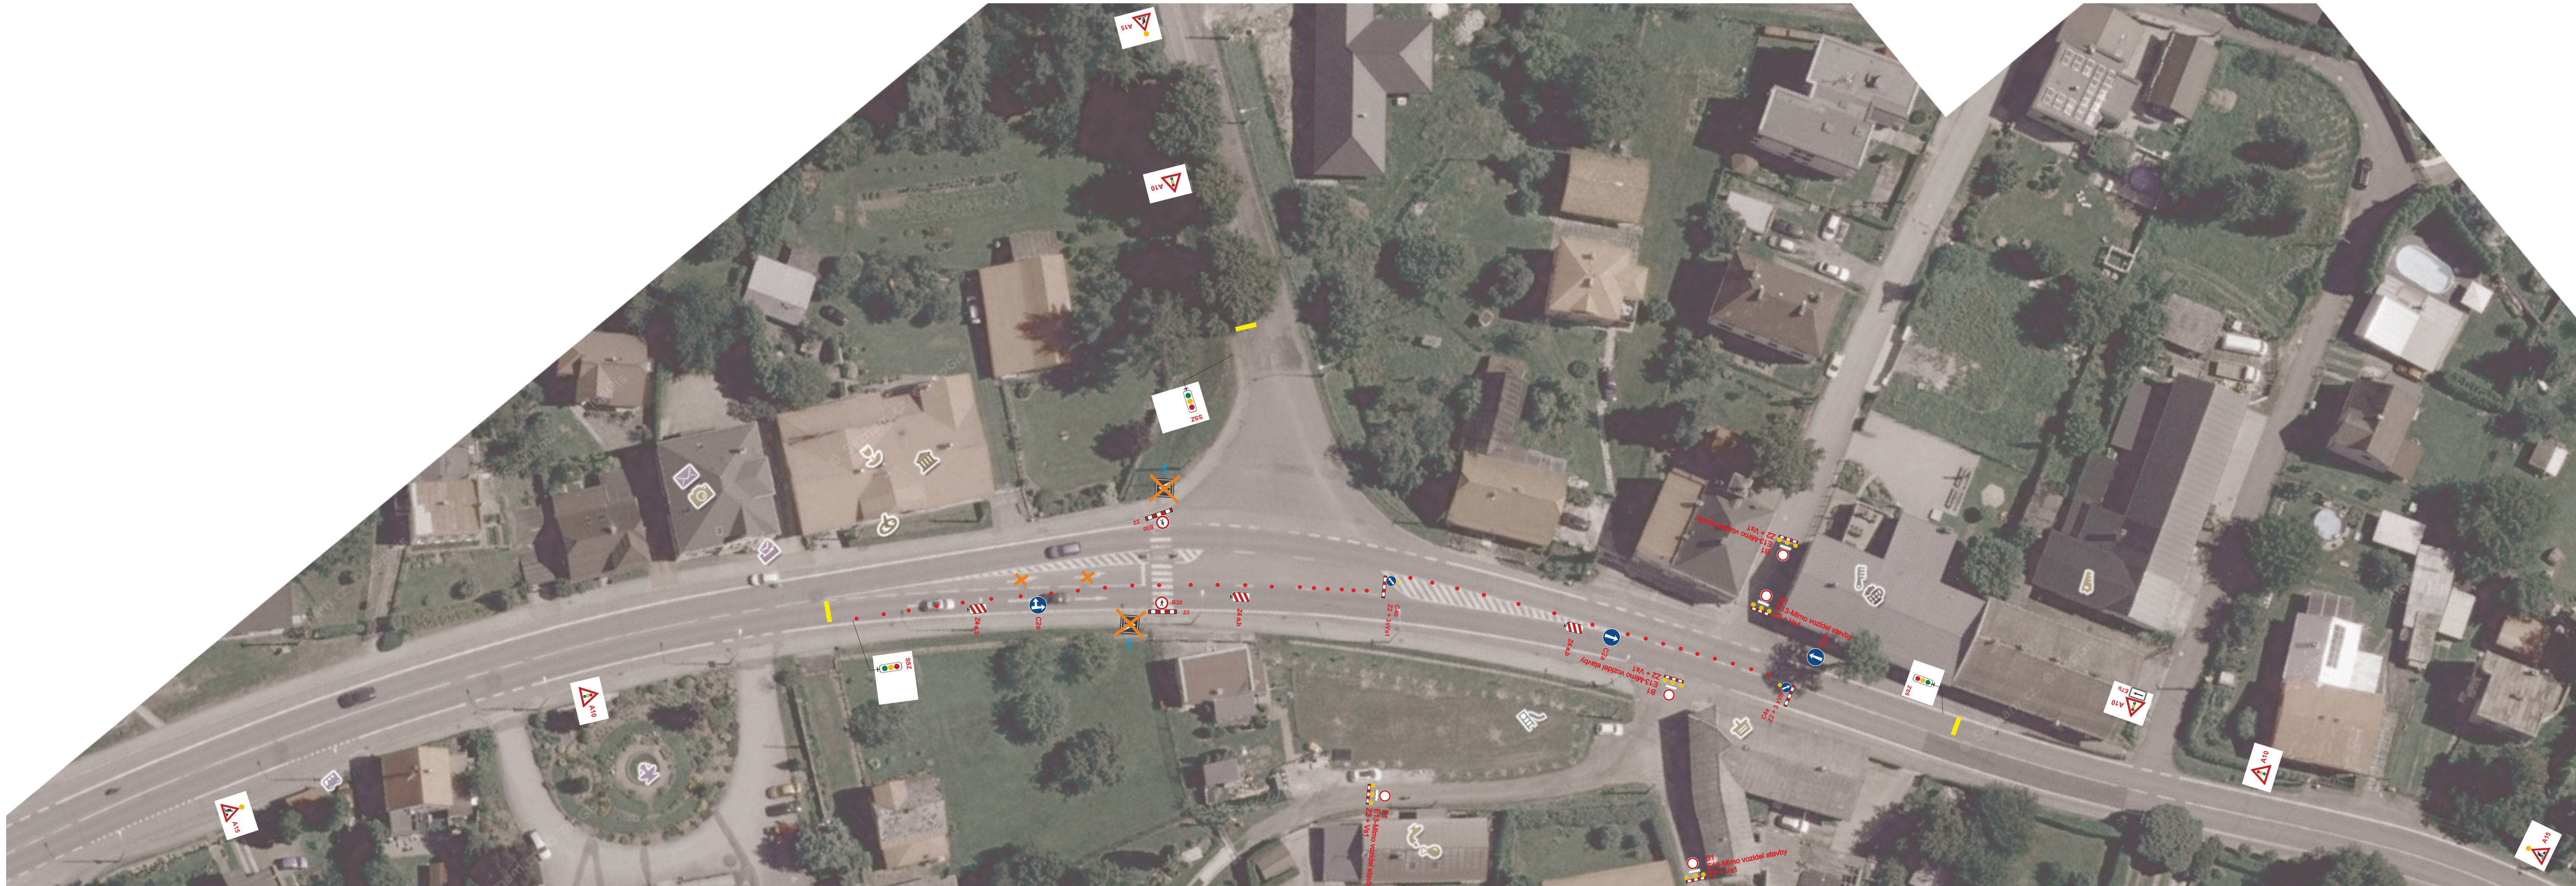

Etapu 8.

-  B28 umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  A10 stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  B20a přechodné DZ


Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmorovice (střed)


K. ú. Dětmorovice

Obsah: Přechodné dopravní značení

Vypracoval: Ing. Tomáš Vlášek



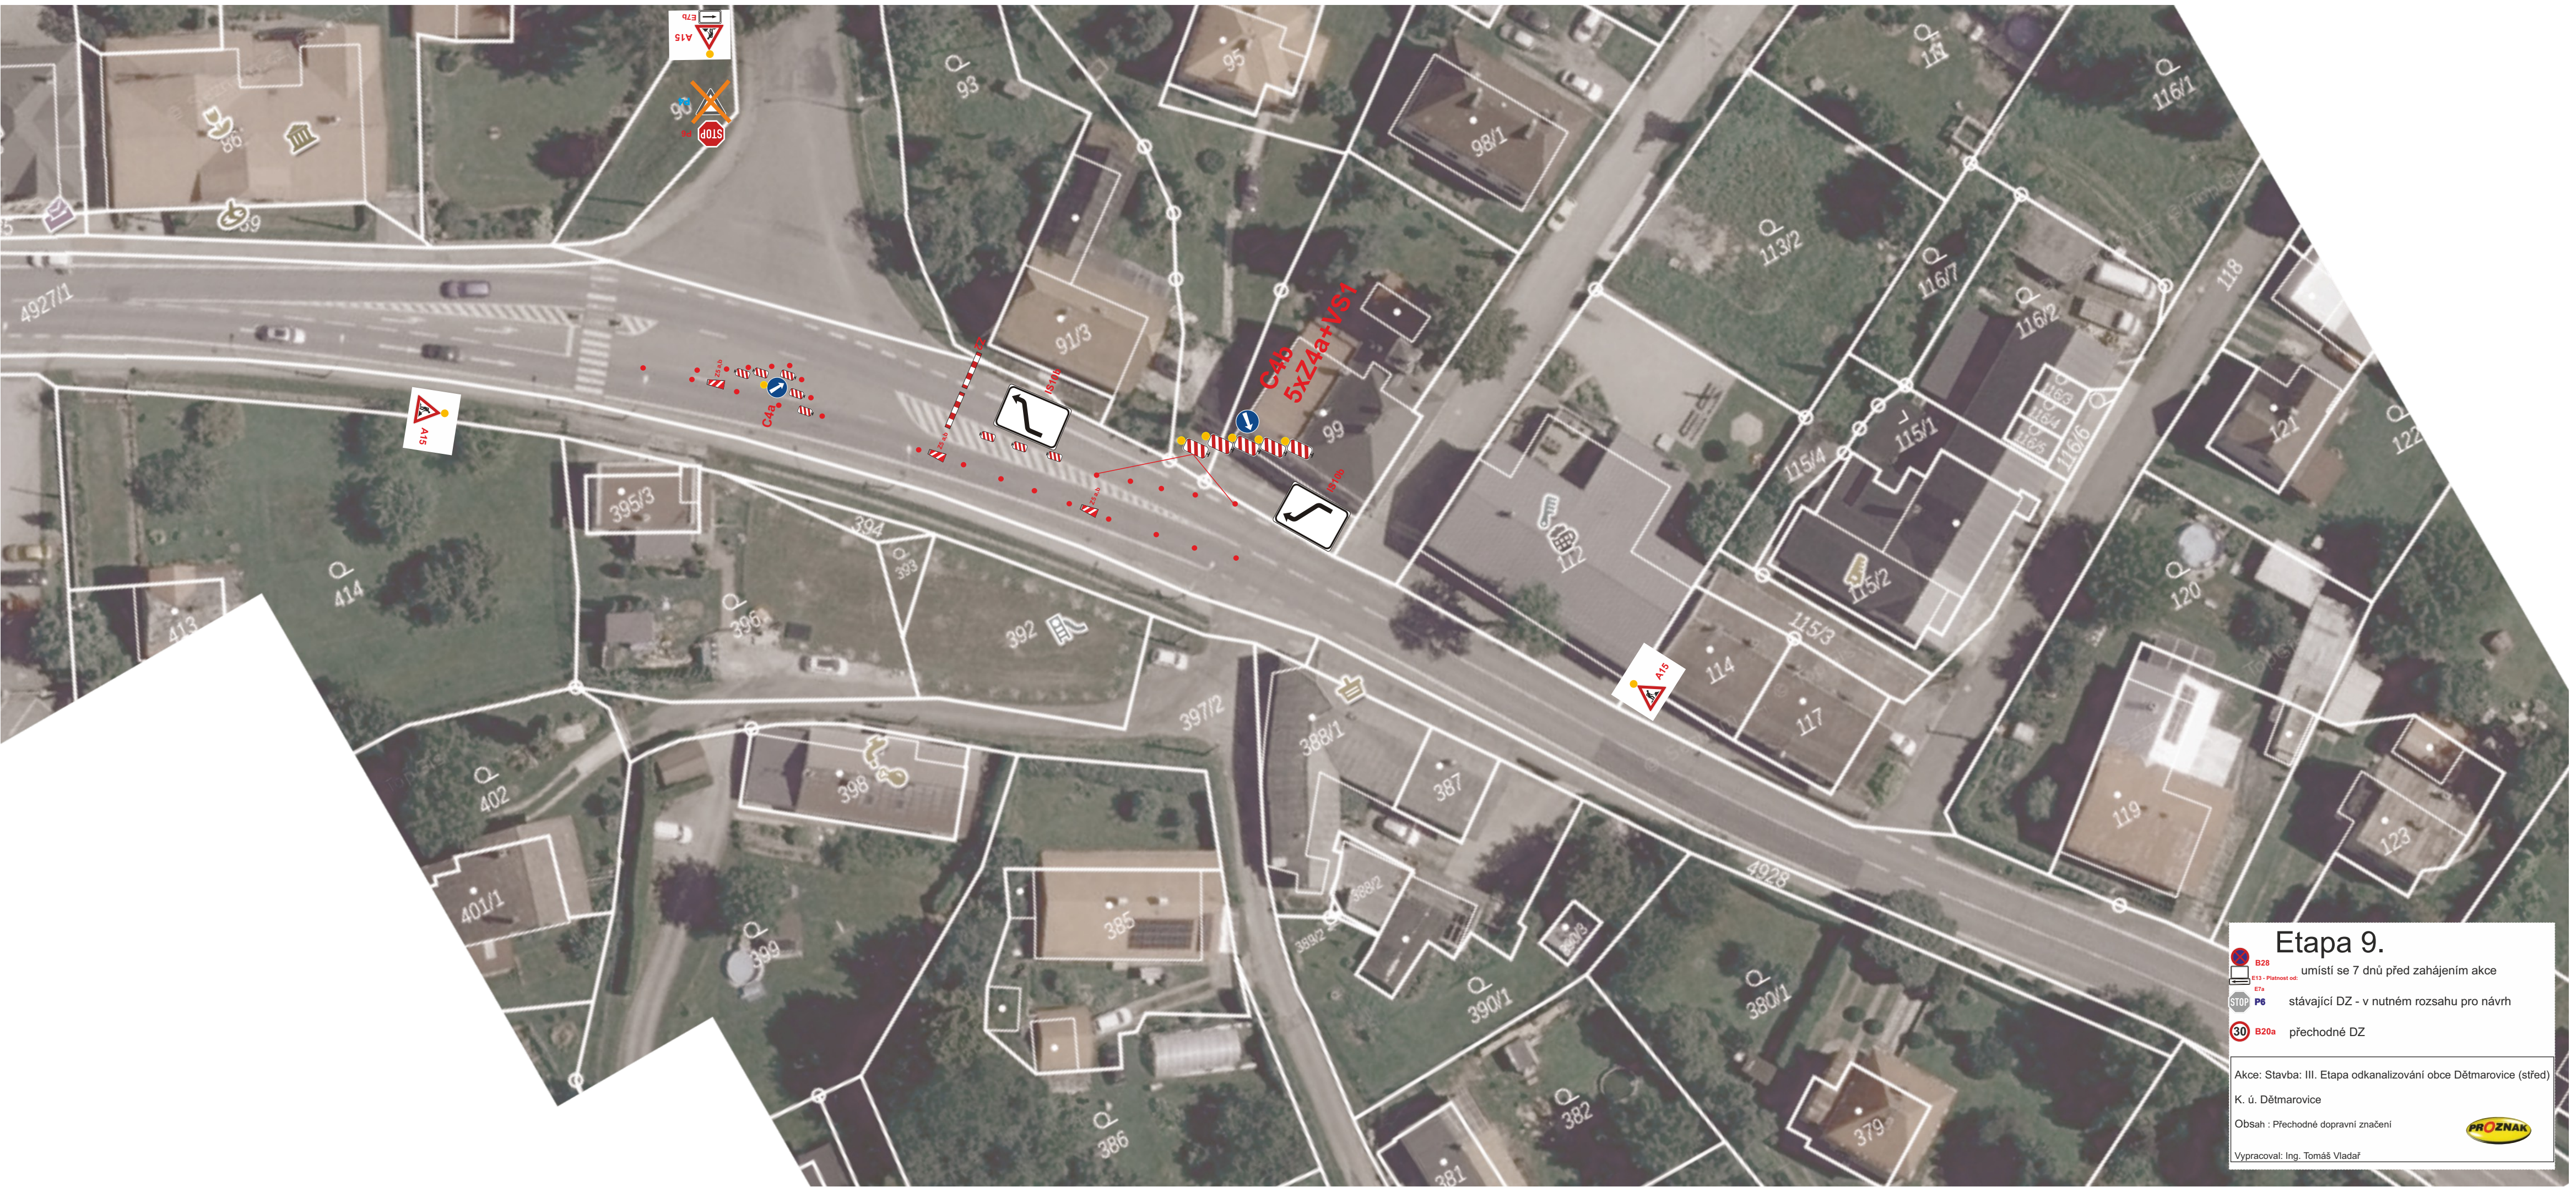


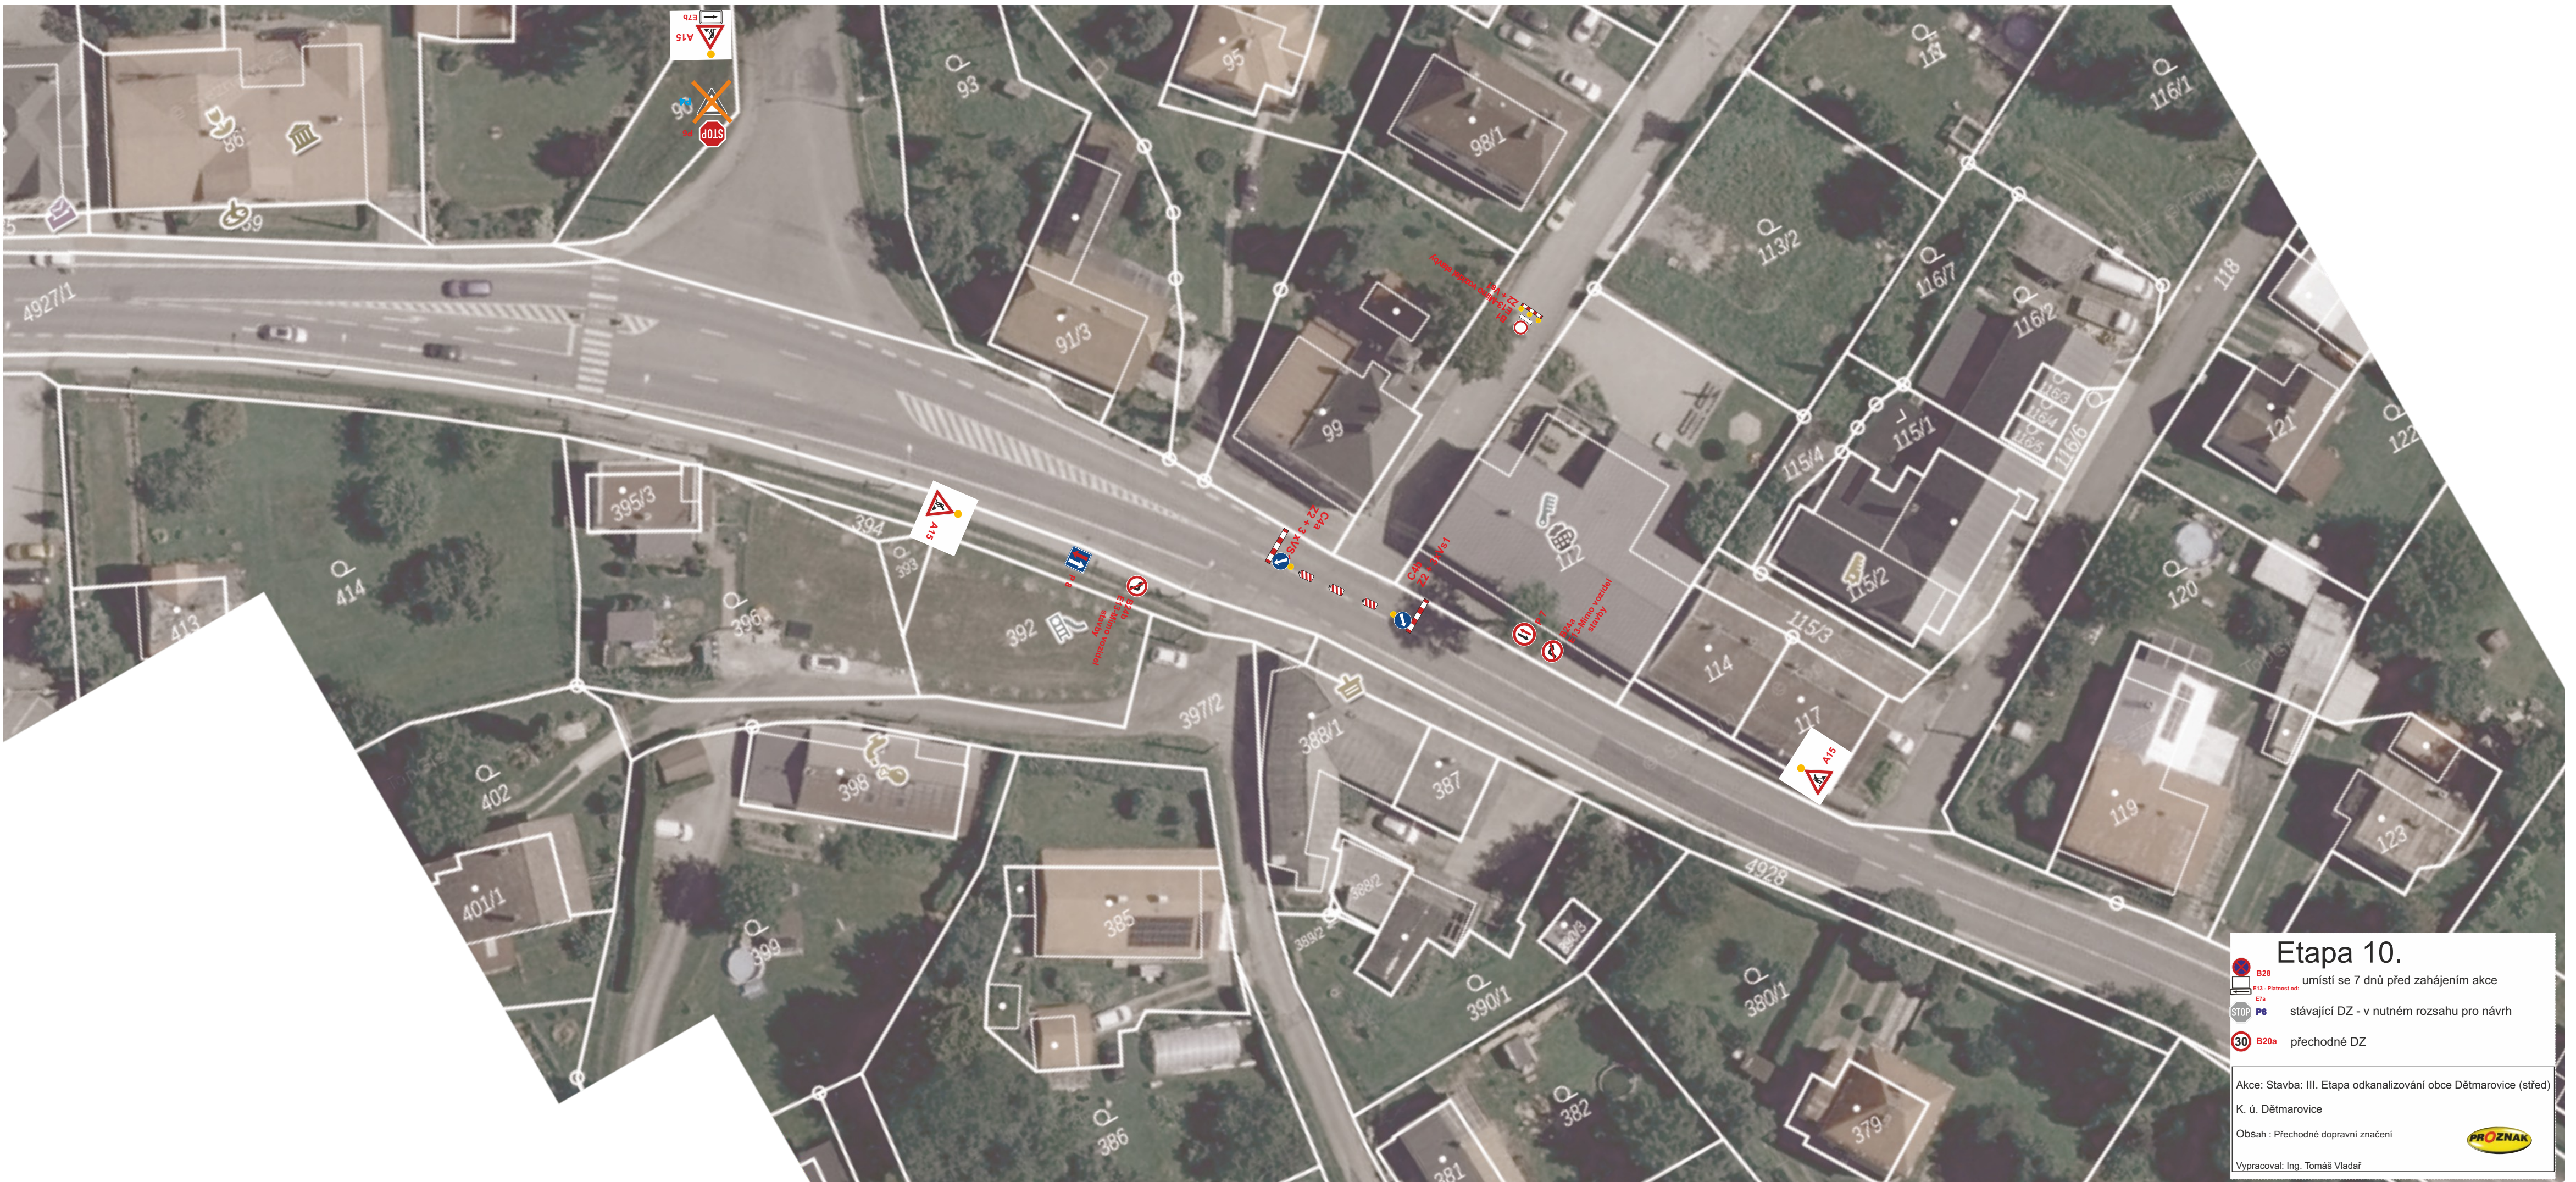

- Etapa 10.**
-  **B21** umístí se 7 dnů před zahájením akce
 -  **E7a** umístí se 7 dnů před zahájením akce
 -  **P8** stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
 -  **B20a** přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmorovice (střed)
K. ú. Dětmorovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vlasťák



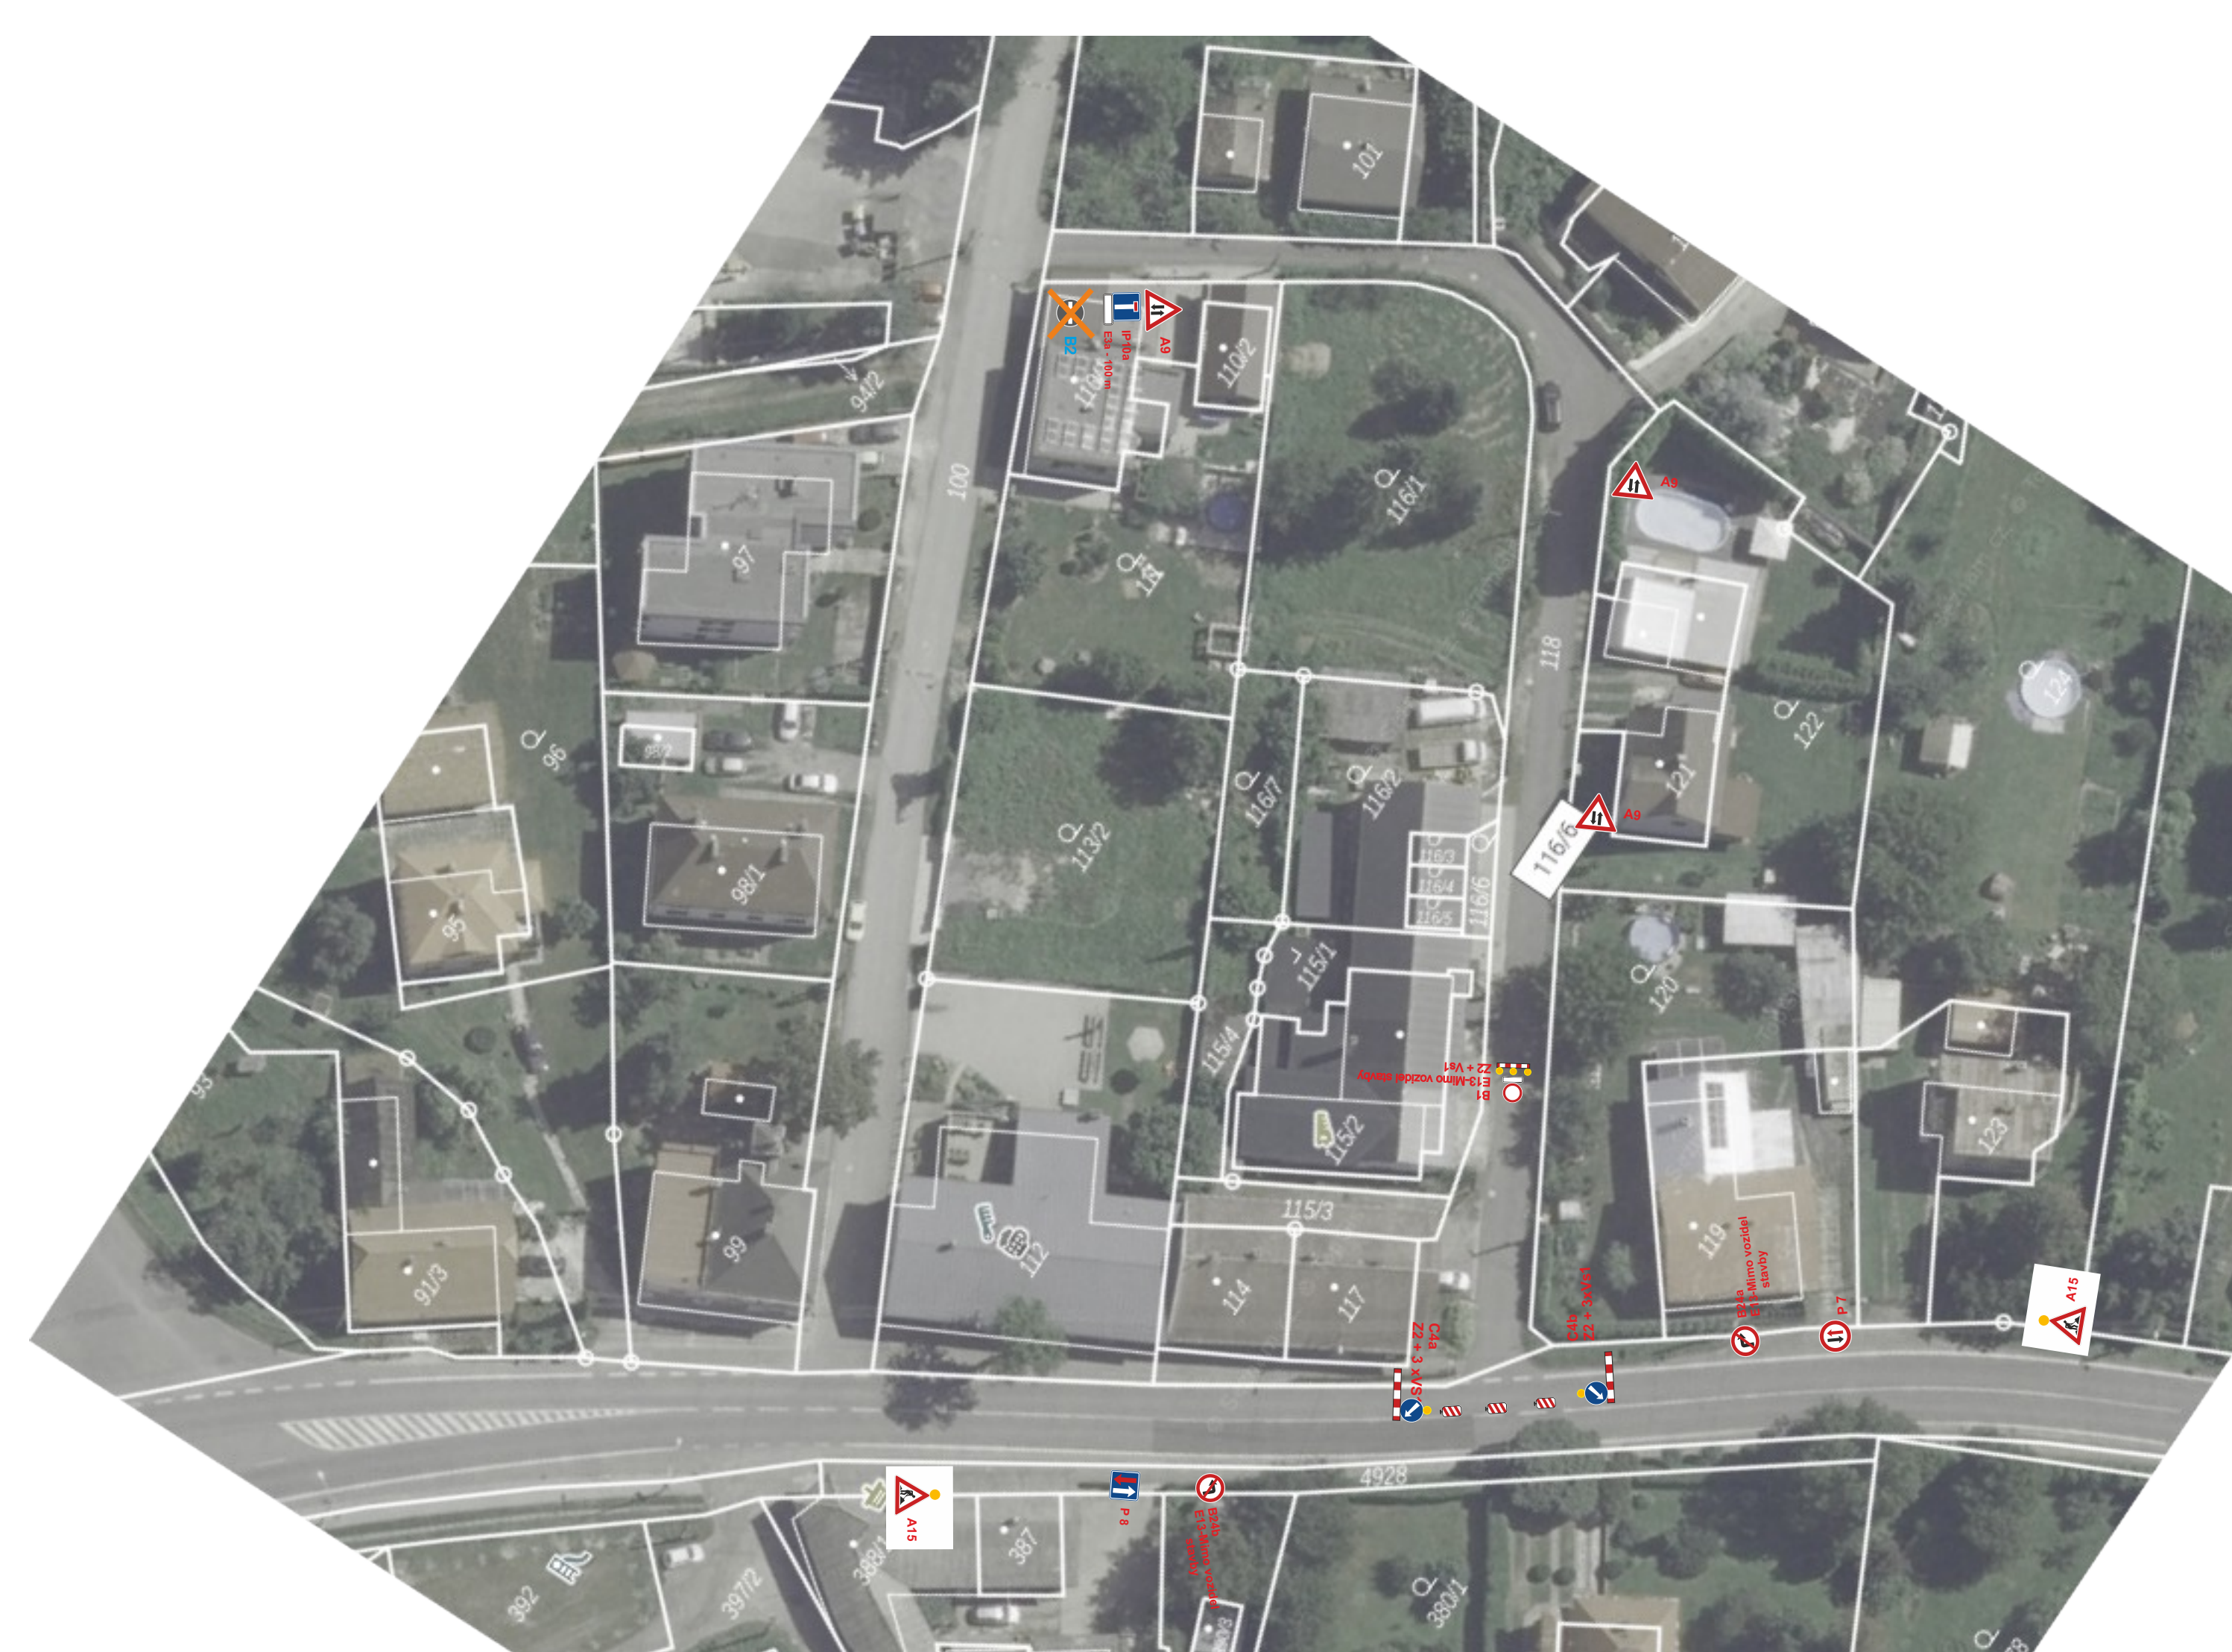

- Etapa 11.**
-  **B20** umístí se 7 dnů před zahájením akce
 -  **A15** - Platnost od: 8.7.
 -  **P8** stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
 -  **B20a** přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. u. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vlášek






Etapa 12.

-  B20 umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  B20a stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  B20a přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah: Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vlasák





Etapa 13.

-  B20 umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  E13 - Přechodní od
-  P6 stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  B20a přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vlasák





 Etapa 14.

-  **B28** umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  **E13 - Platnost od:**
-   **F6** stávající DZ - v nutném rozsahu pro náv
-  **30** **B20a** přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed

K. ú. Dětmarovice

Obsah : Přechodné dopravní značení

[illegible]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: D498FD11DF508742A9E7E5AB8159B40BE5662DC54B26C52E41C722C1A6AFA761
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:


Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.3.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj

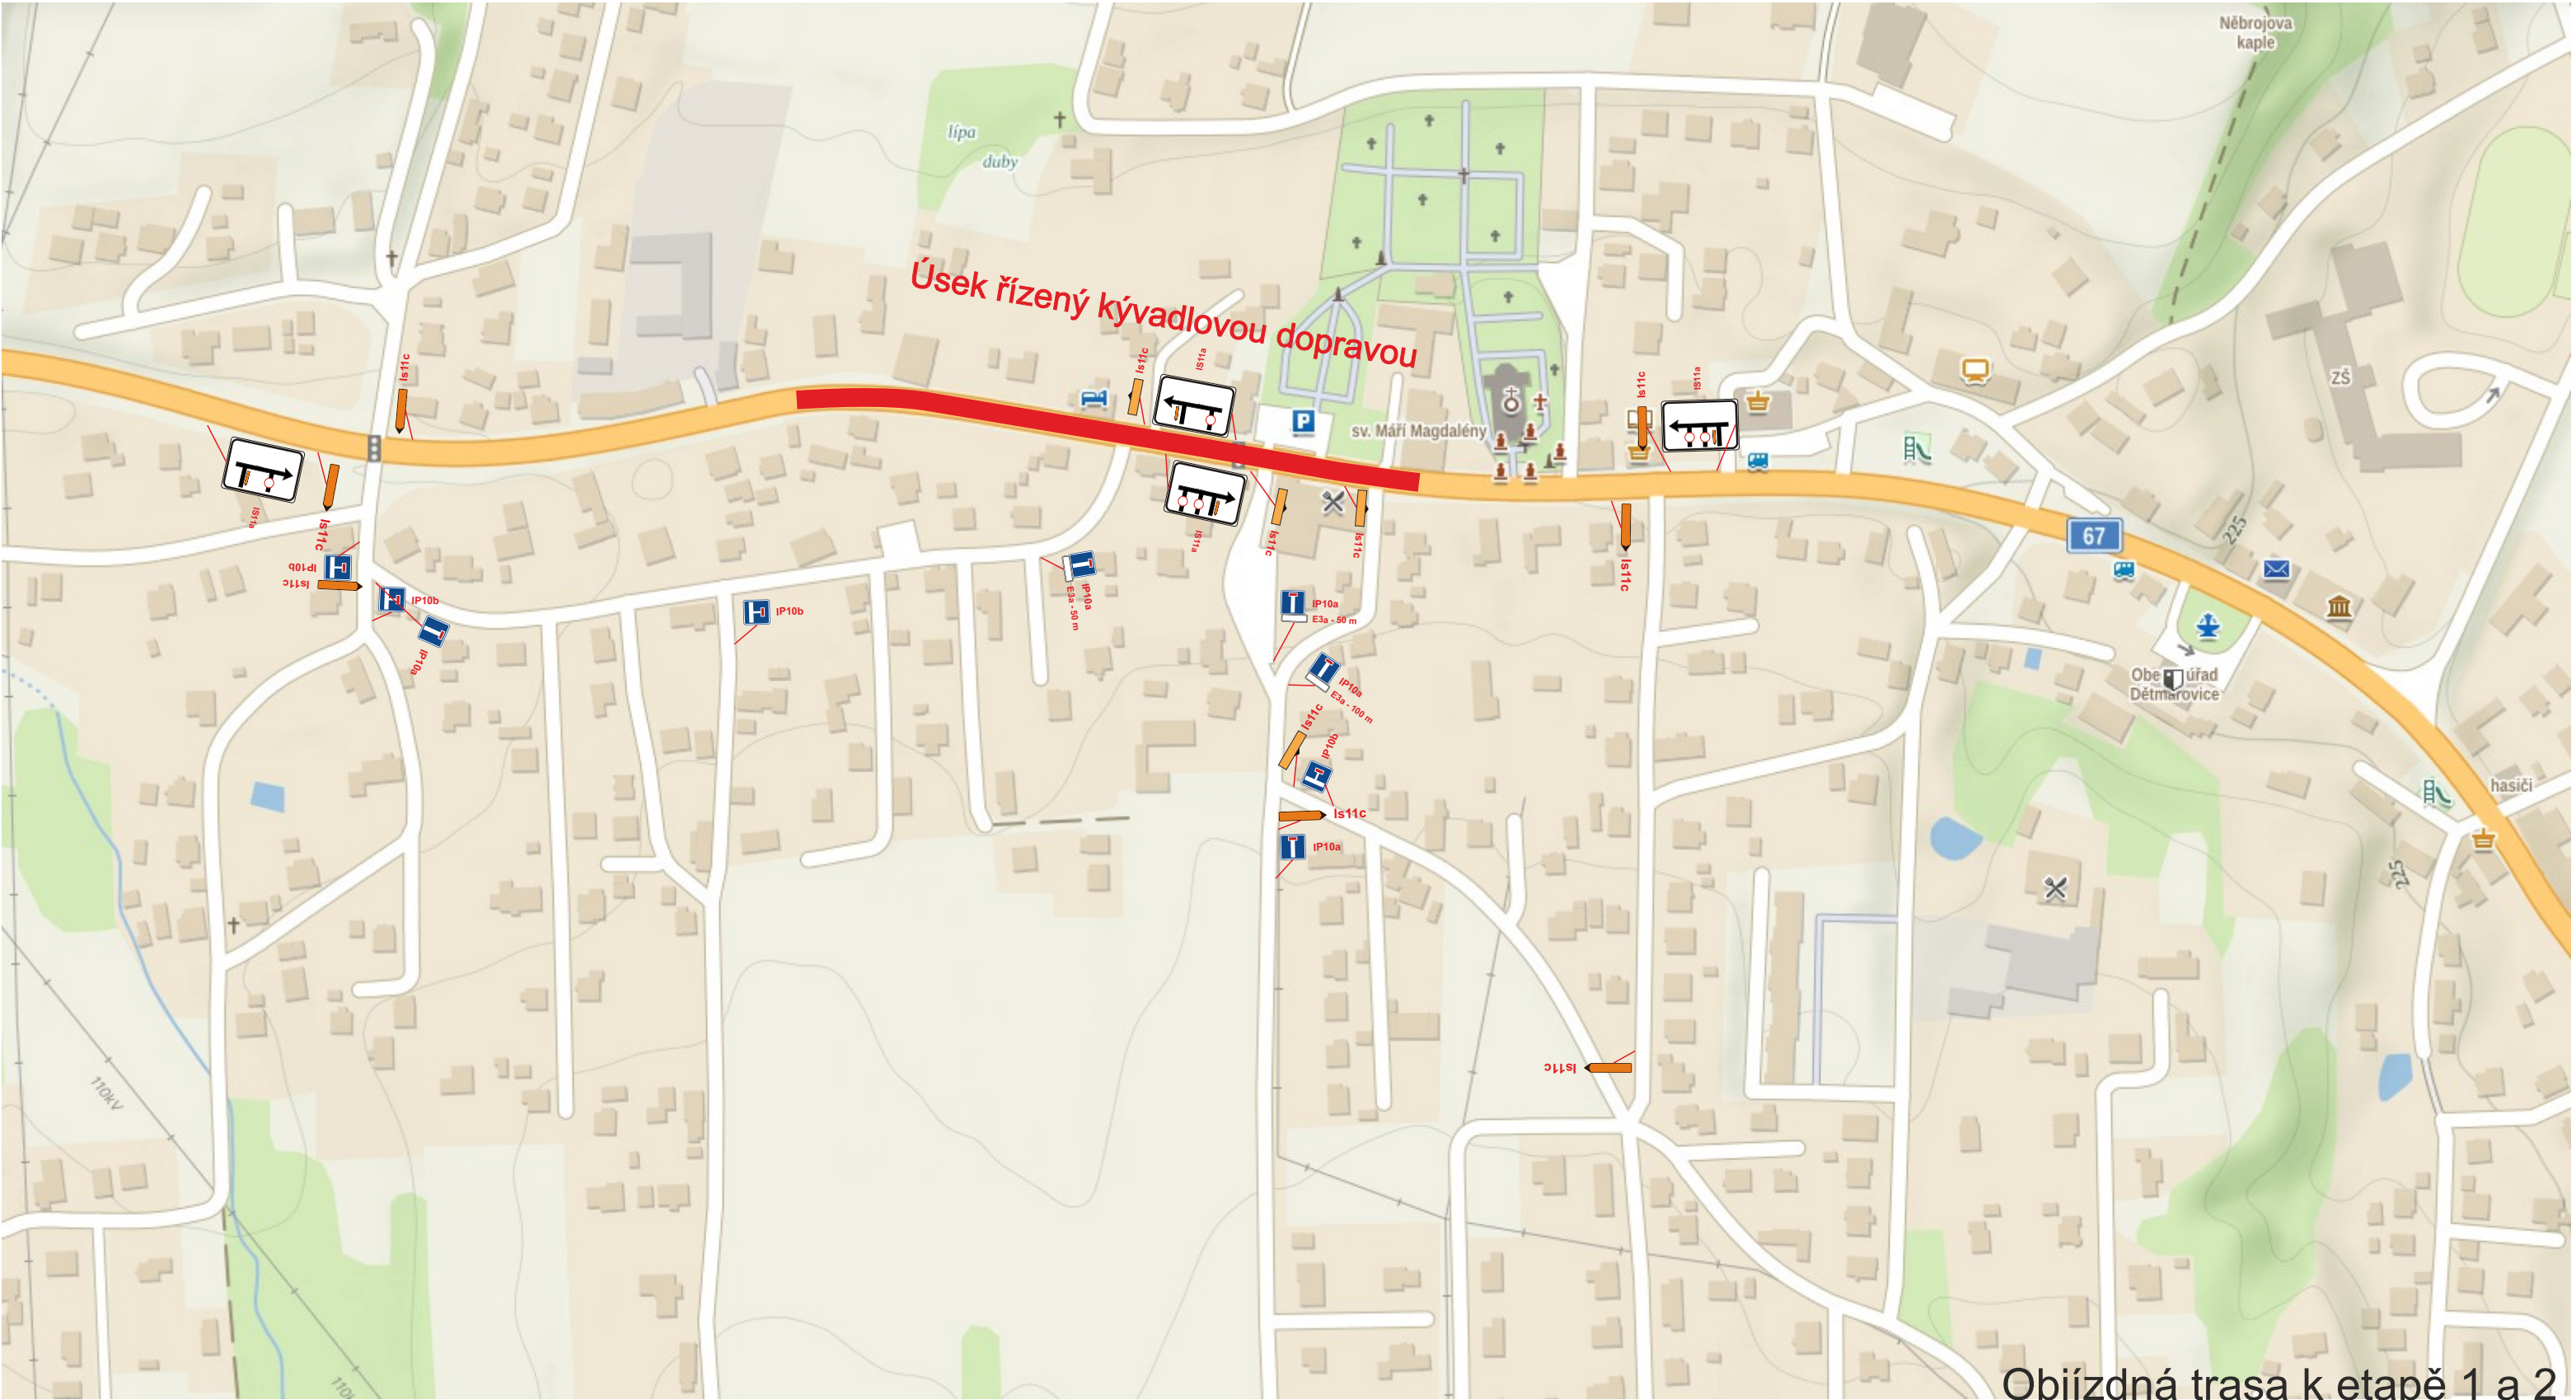


Objízdna trasa k etapě 1 a 2

-  **B28** umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  **E13** - Platnost od: **E7a**
-  **P6** stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  **B20a** přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladař



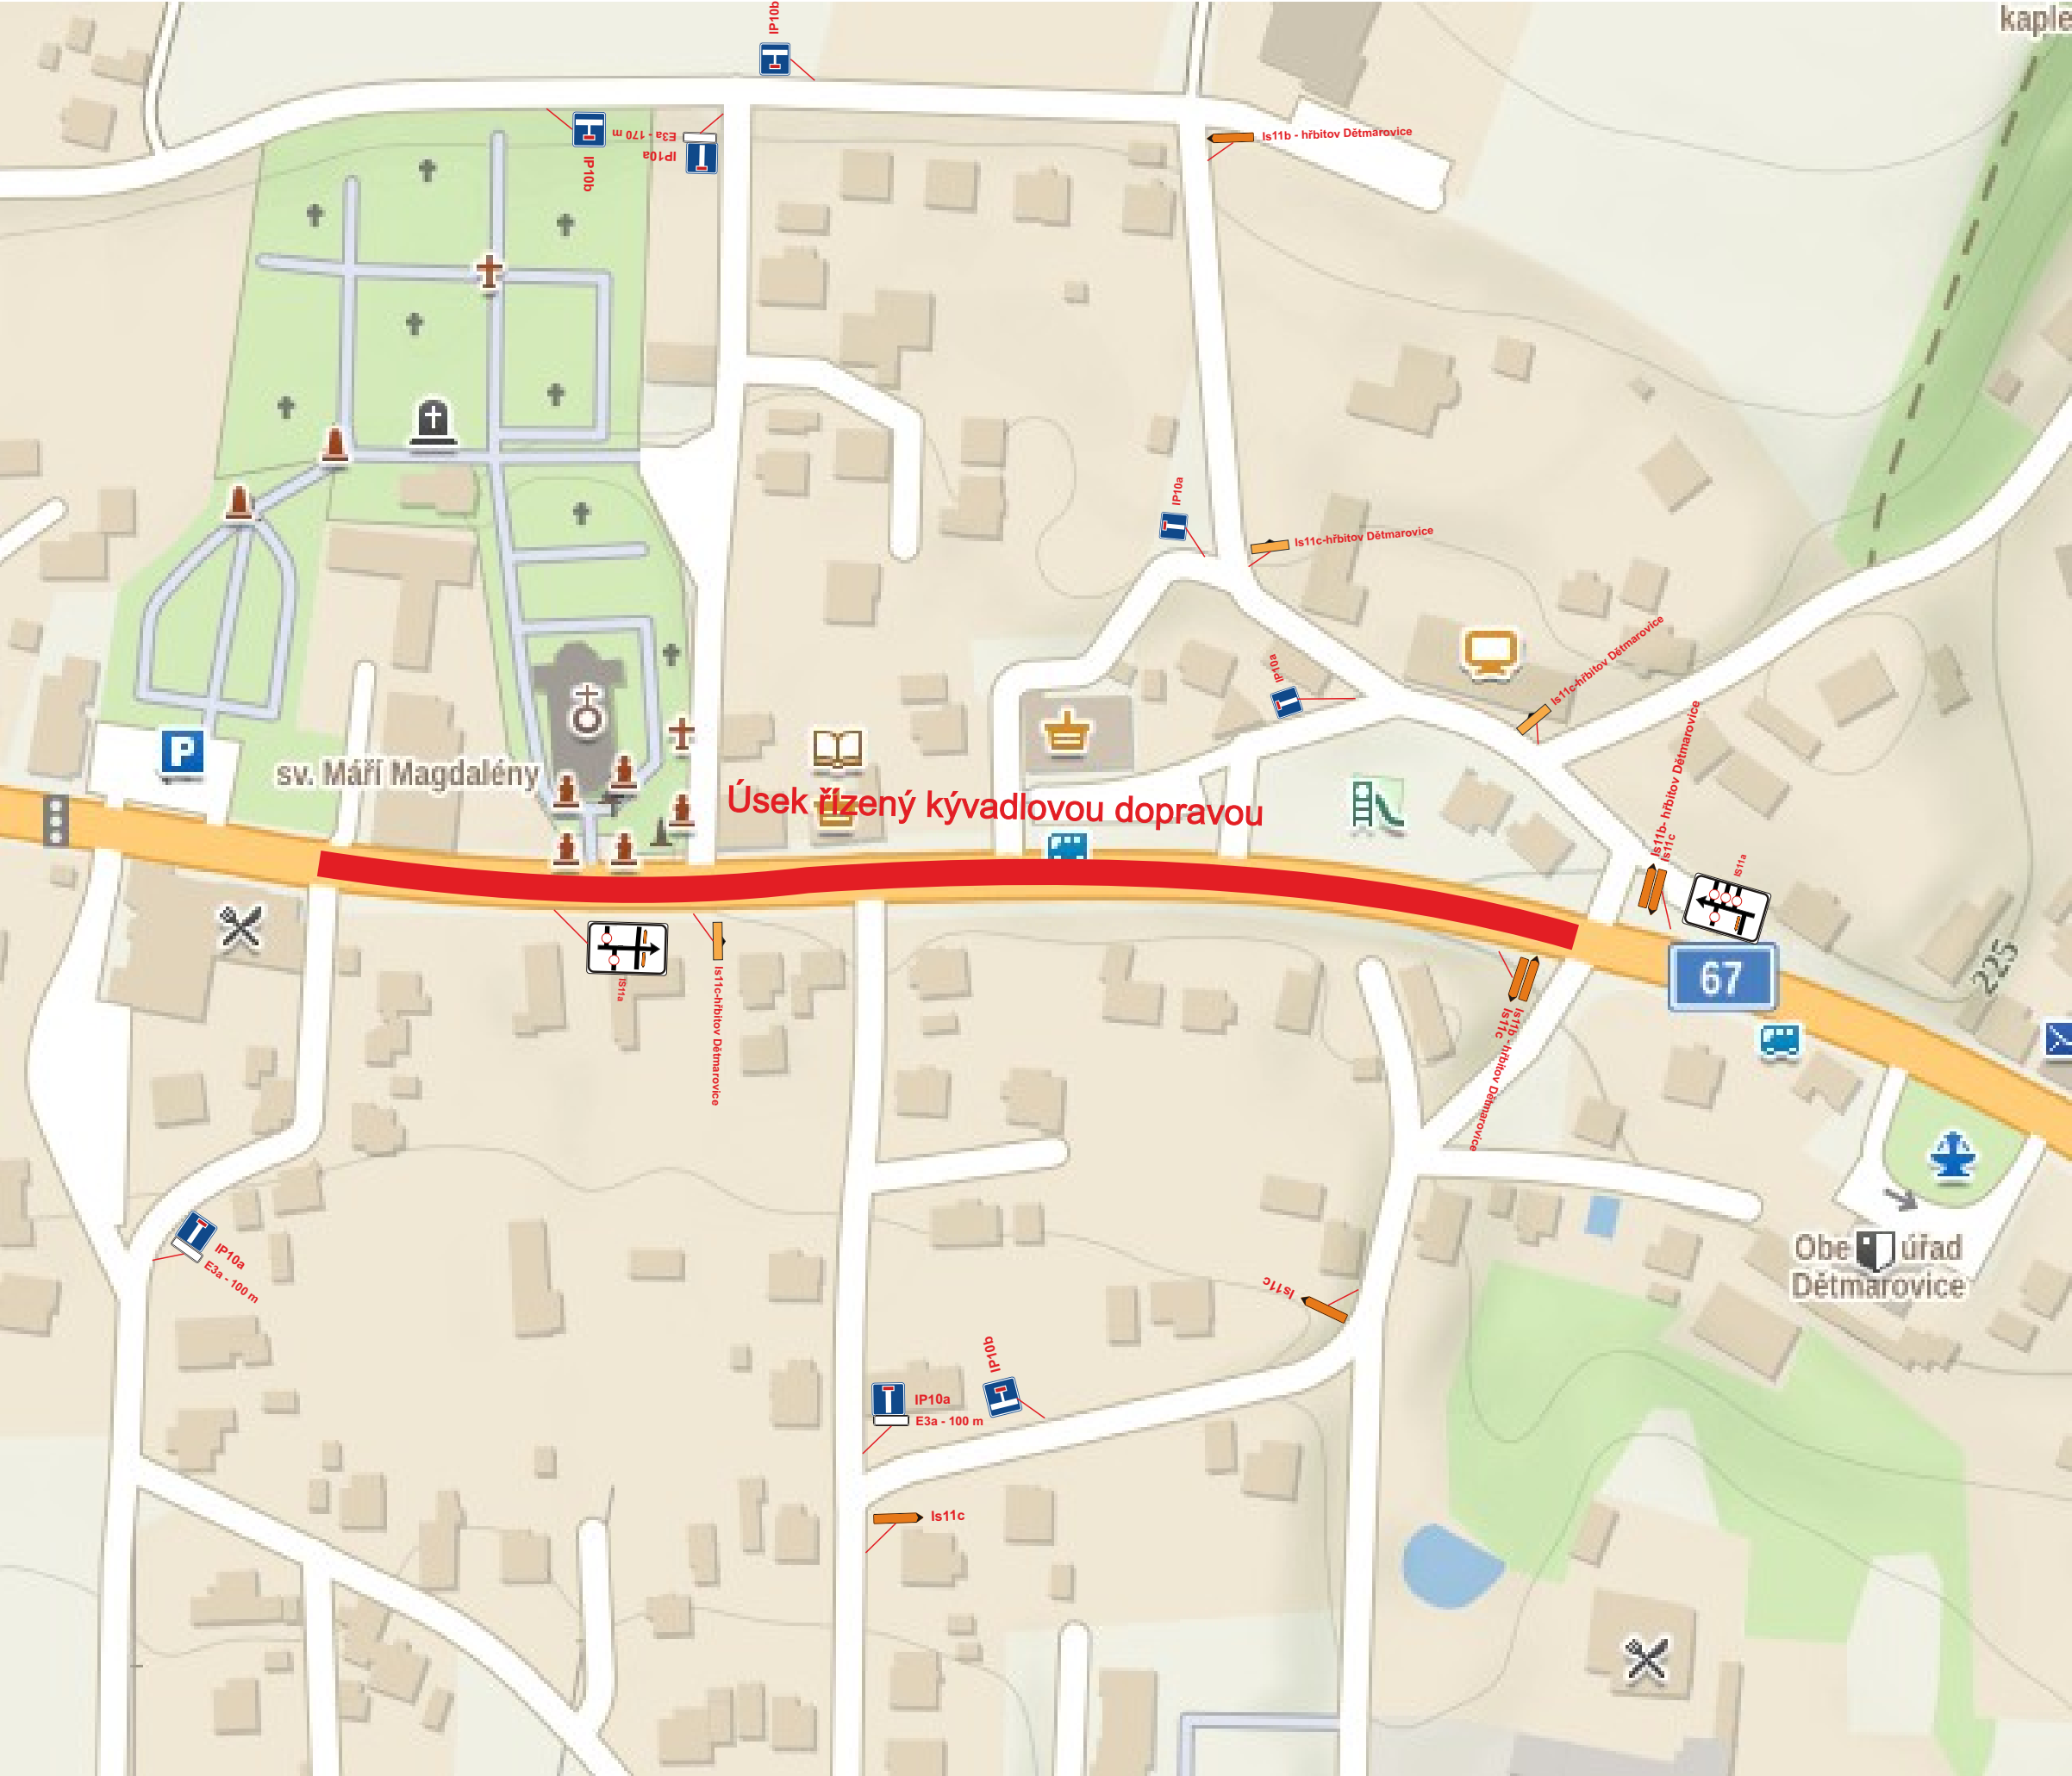



Objízdná trasa k etapě 3 a 4

-  **B28** umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  **E13** - Platnost od: **E7a**
-  **P6** stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  **B20a** přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladař



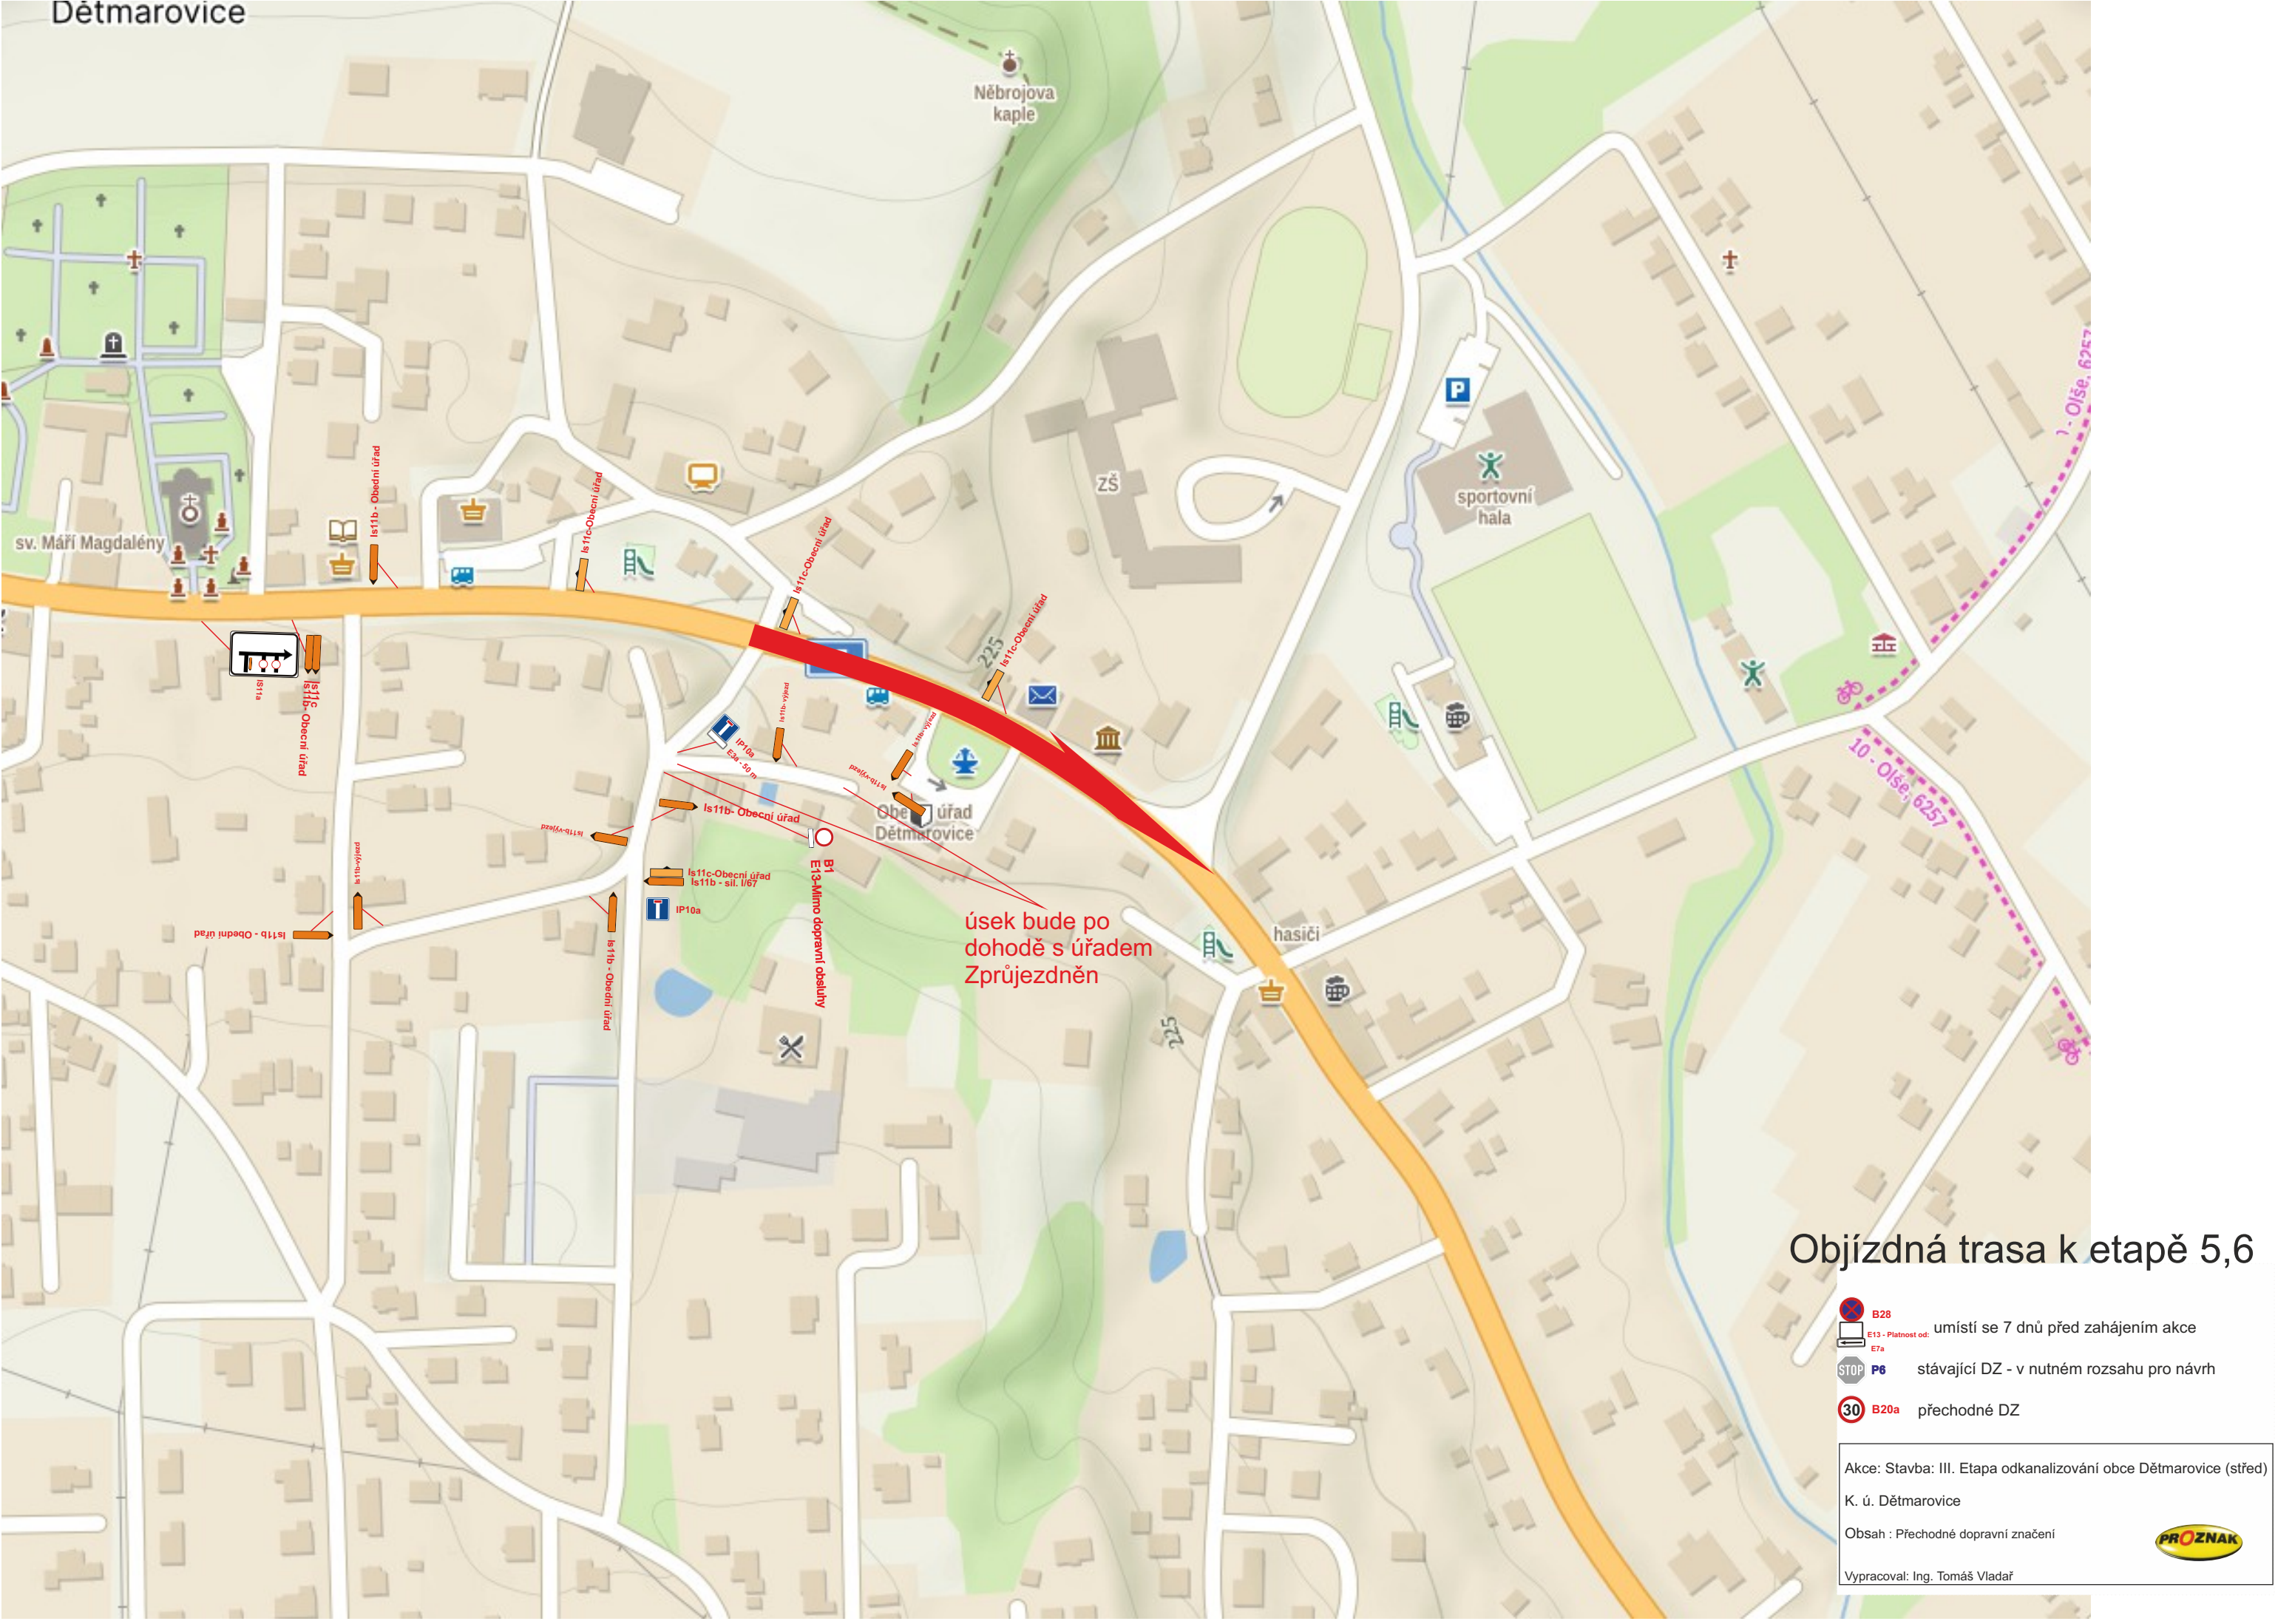

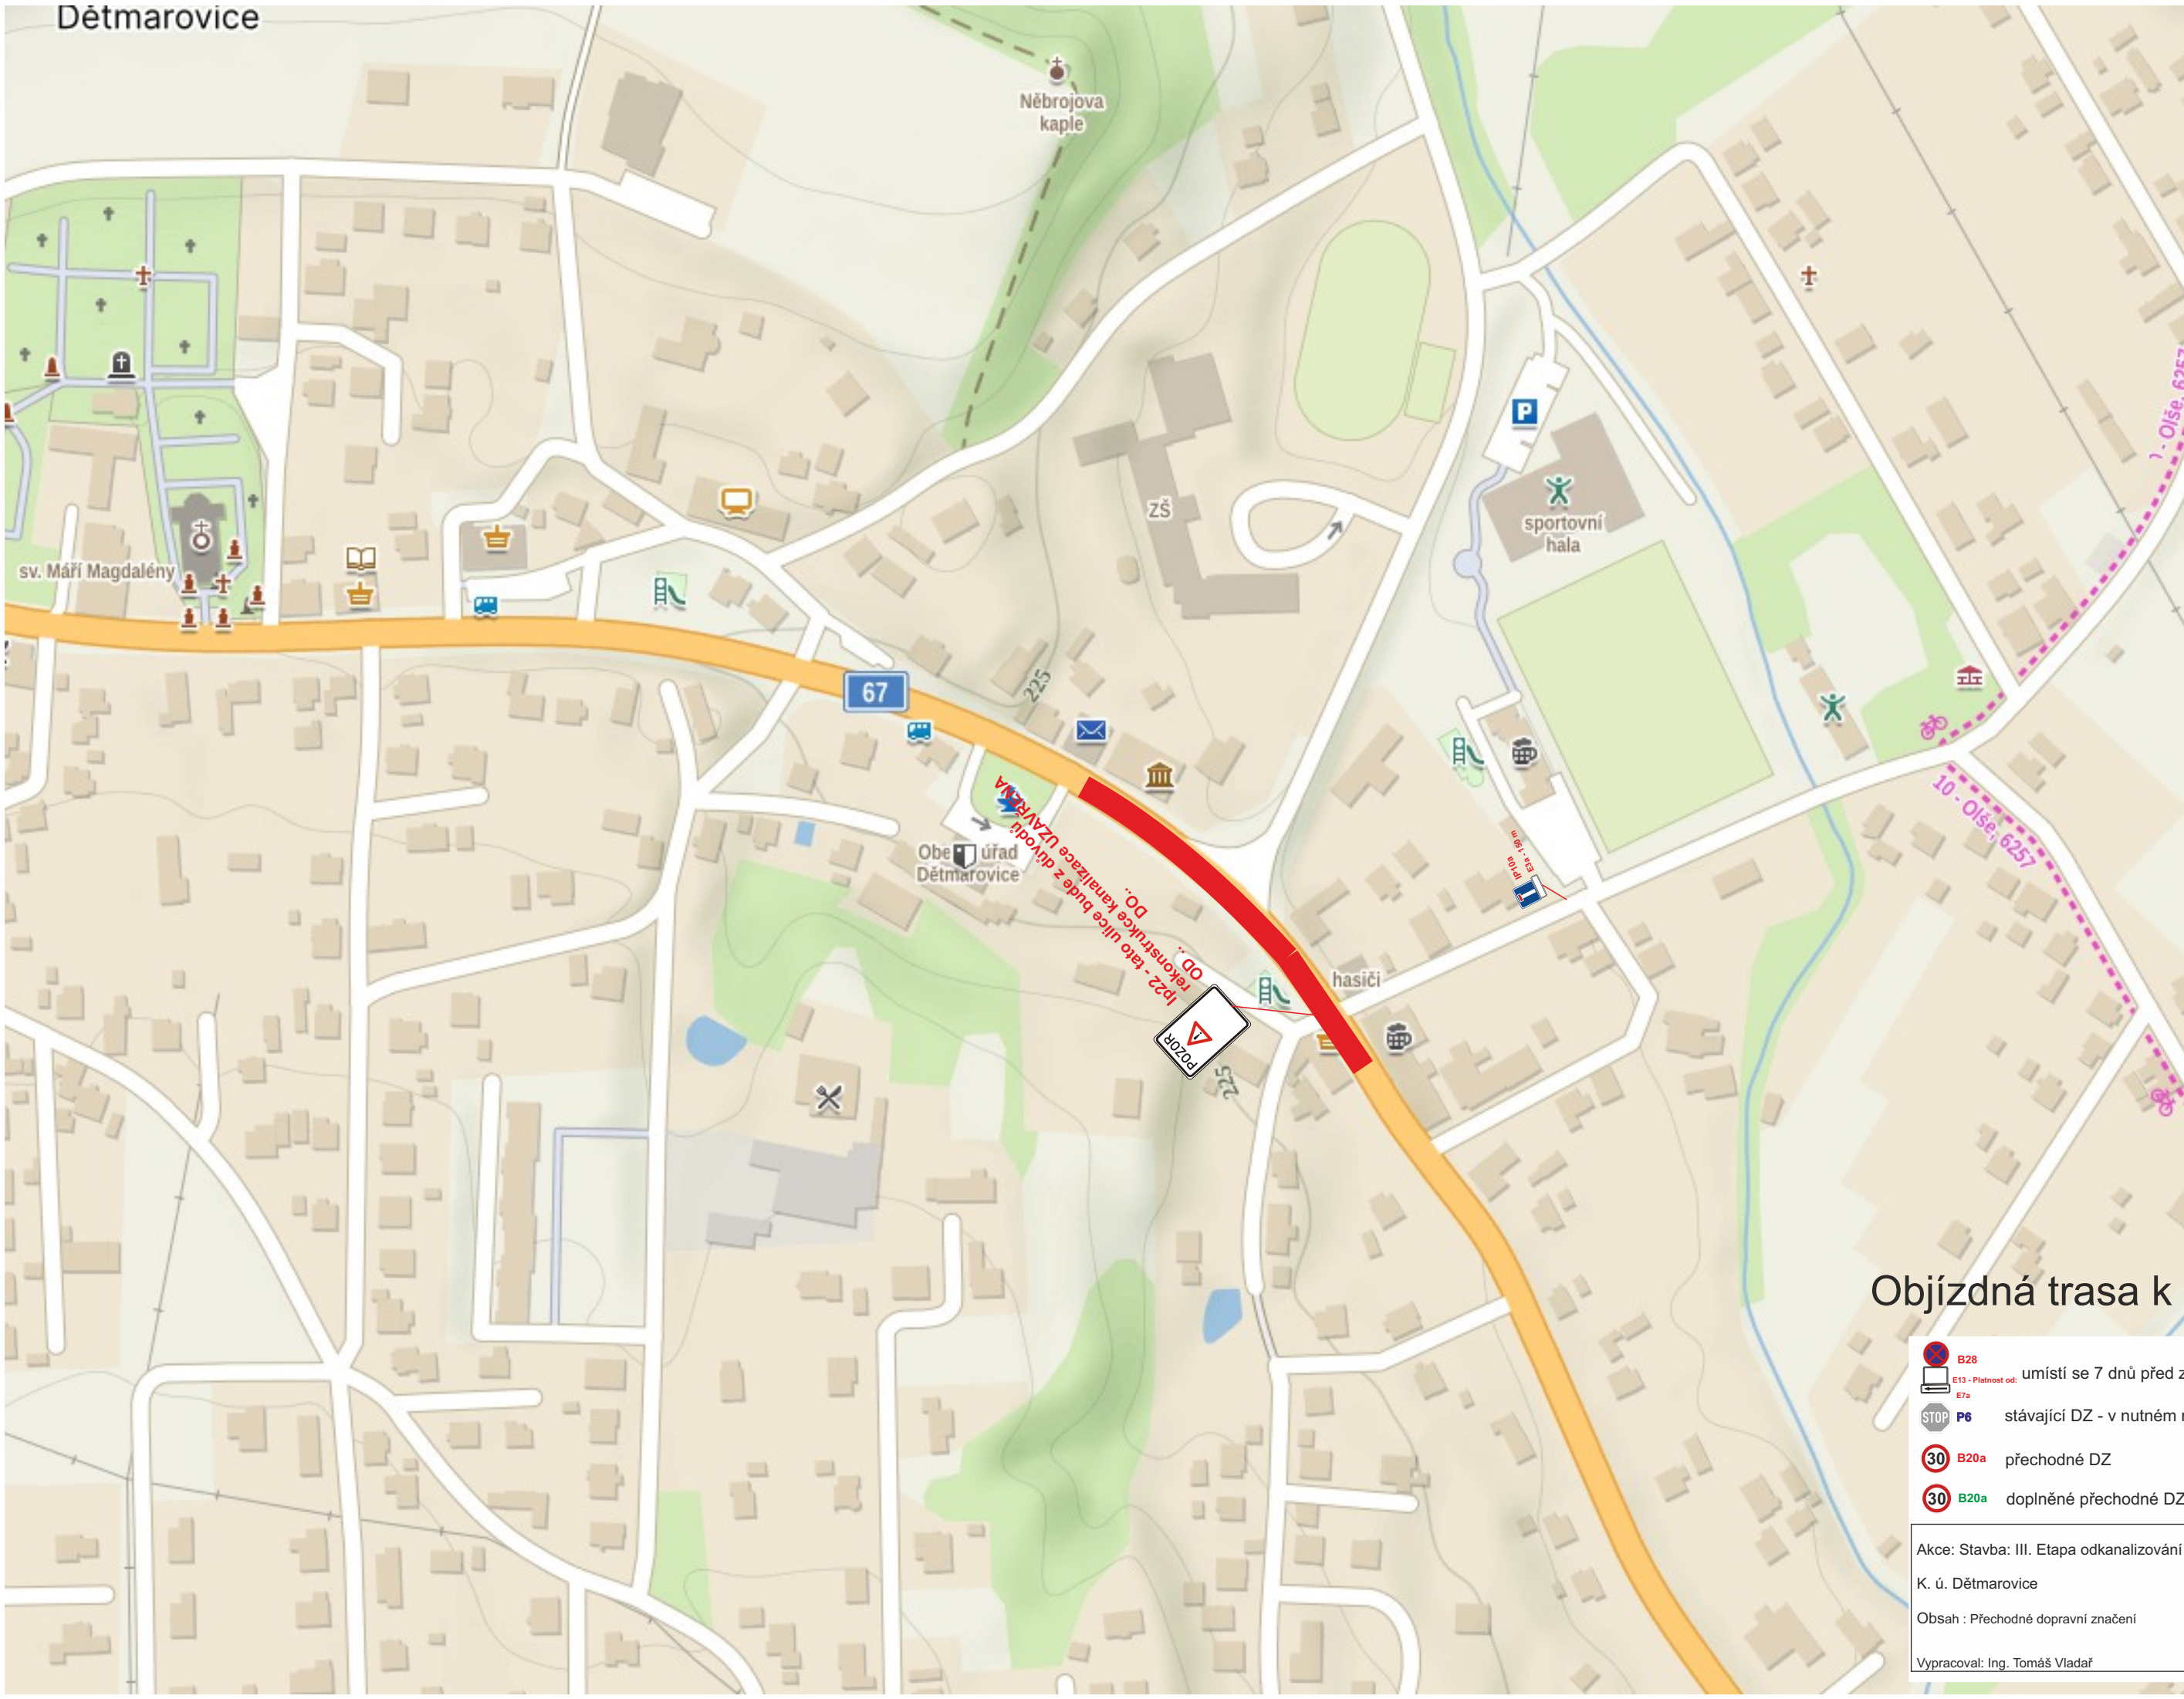


Objízdná trasa k etapě 7,8

- B28** umístí se 7 dnů před zahájením akce
- P6** stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
- B20a** přechodné DZ
- B20a** doplněné přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladař



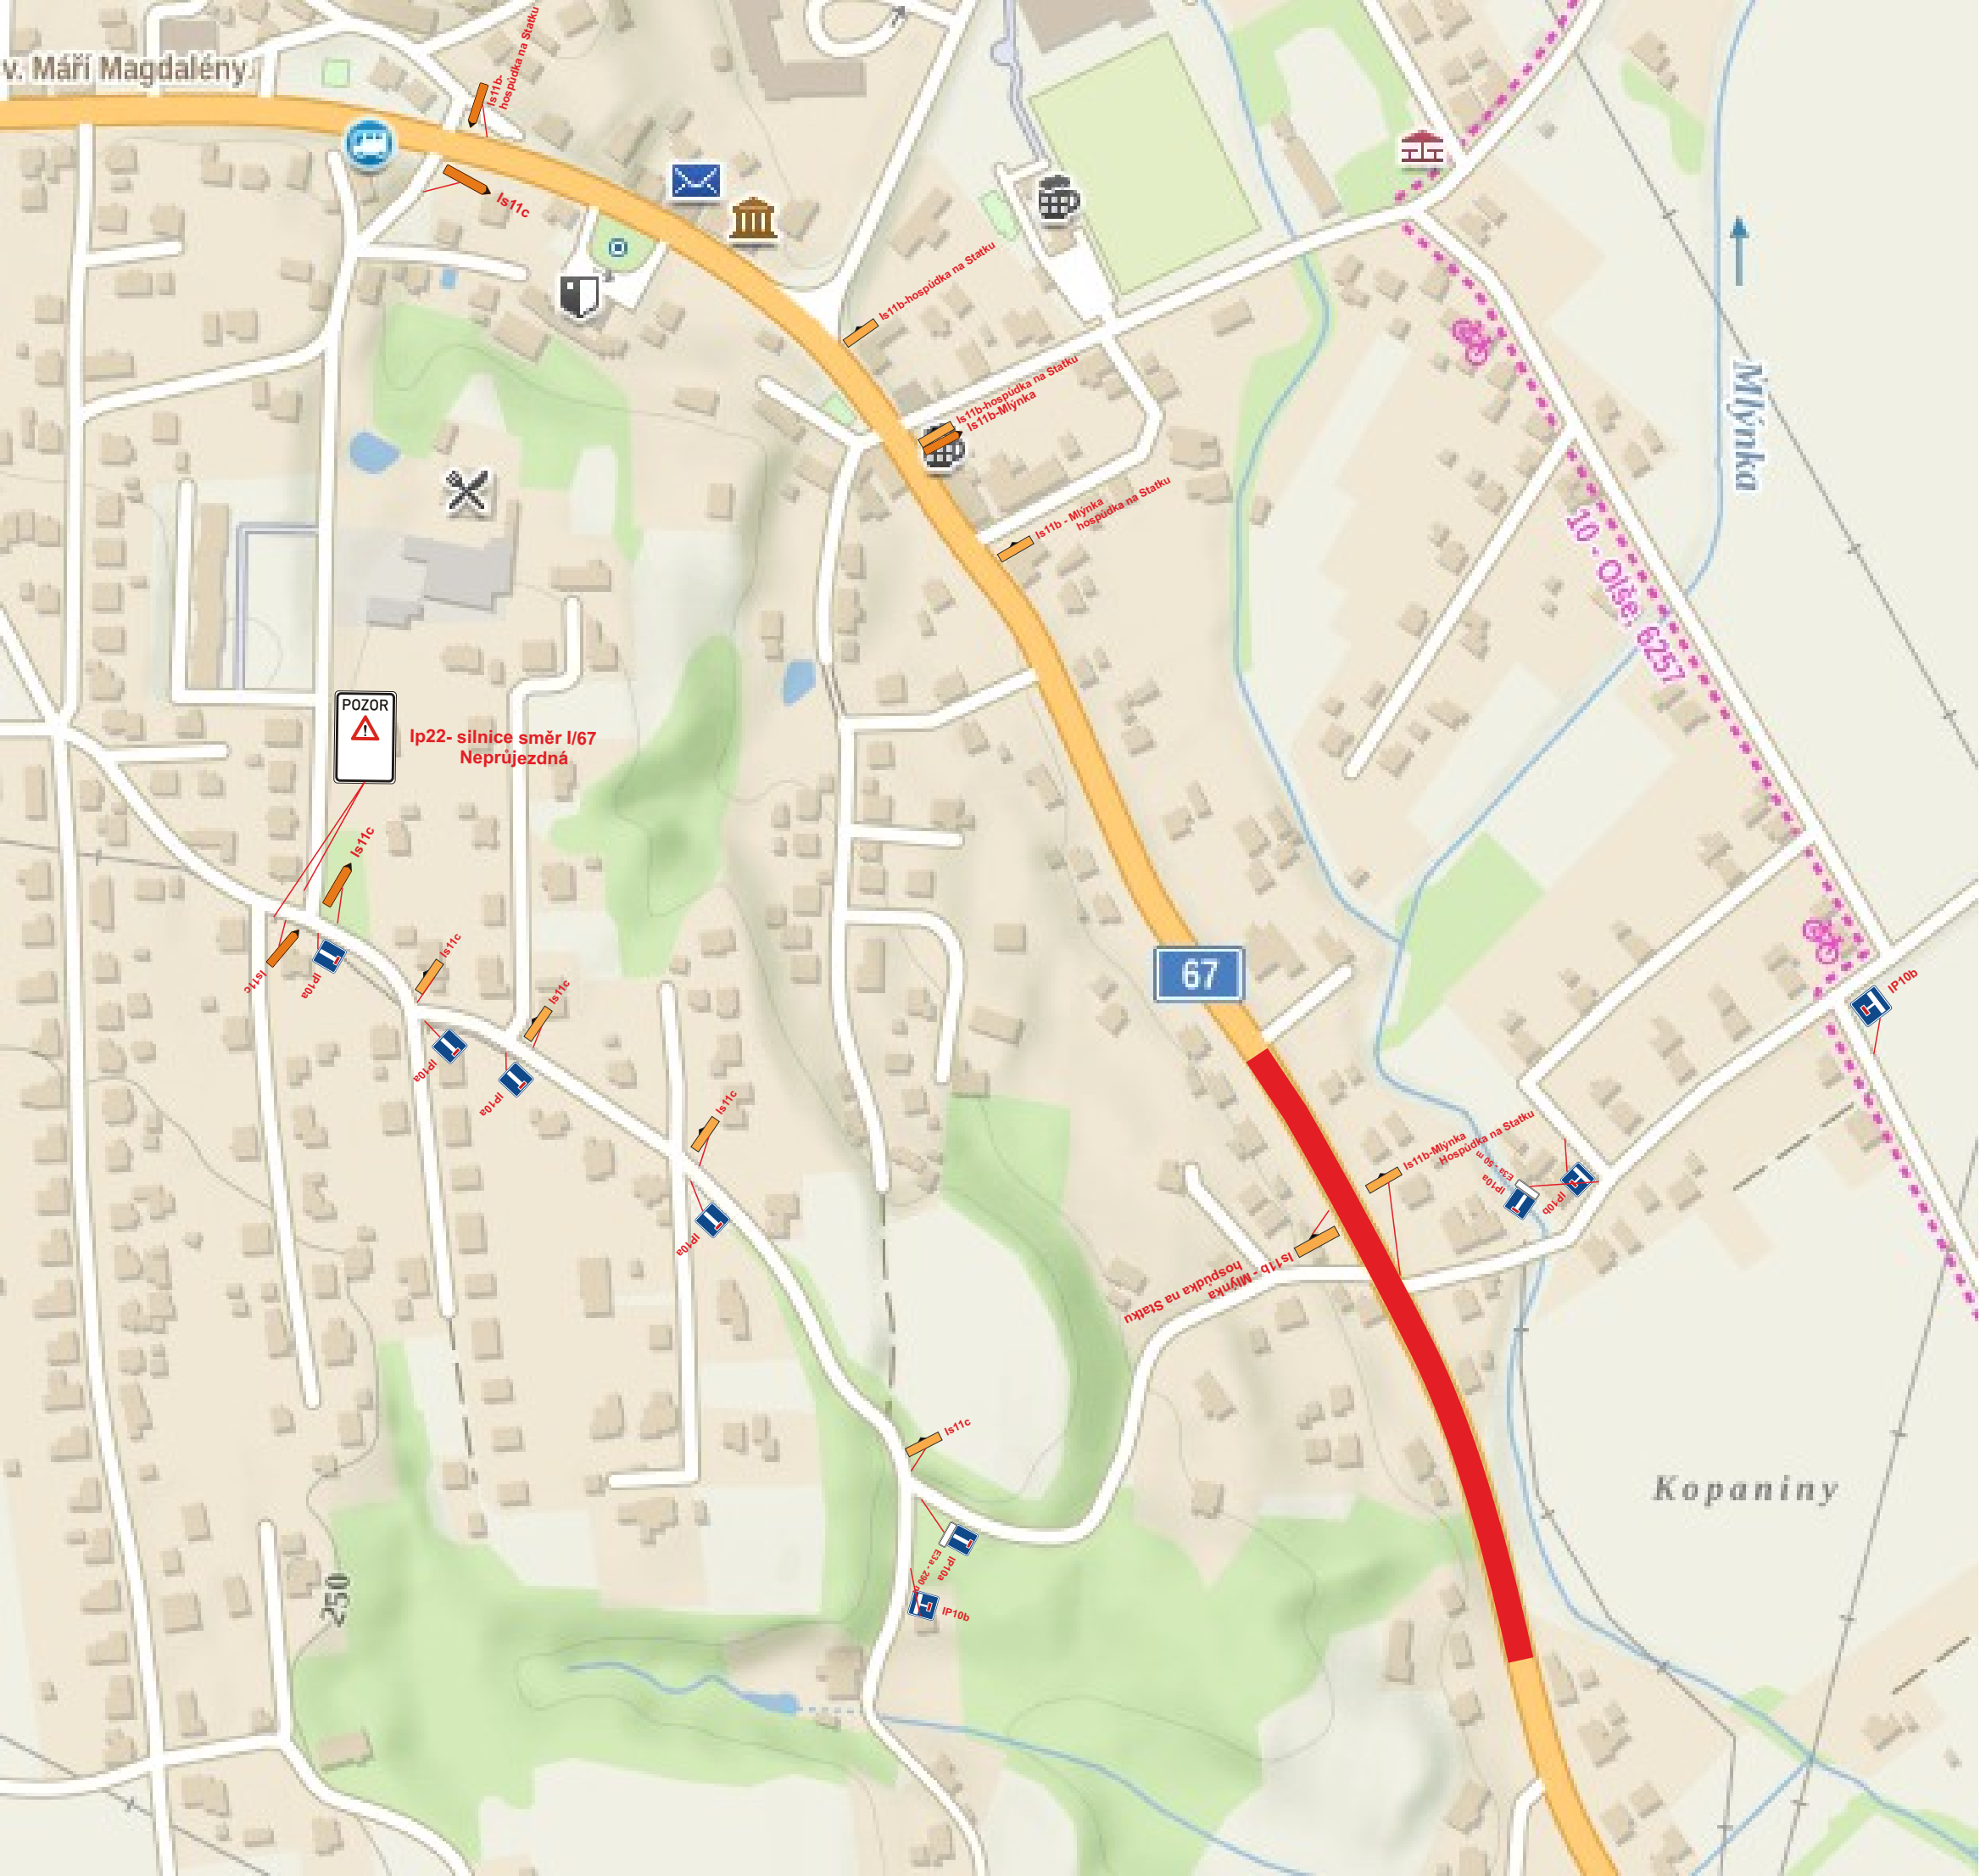


Objízdná trasa k etapě 13

-  **B28** umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  **E13** - Platnost od: **E7a**
-  **P6** stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  **B20a** přechodné DZ
-  **B20a** doplněné přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vypracoval: Ing. Tomáš Vladař



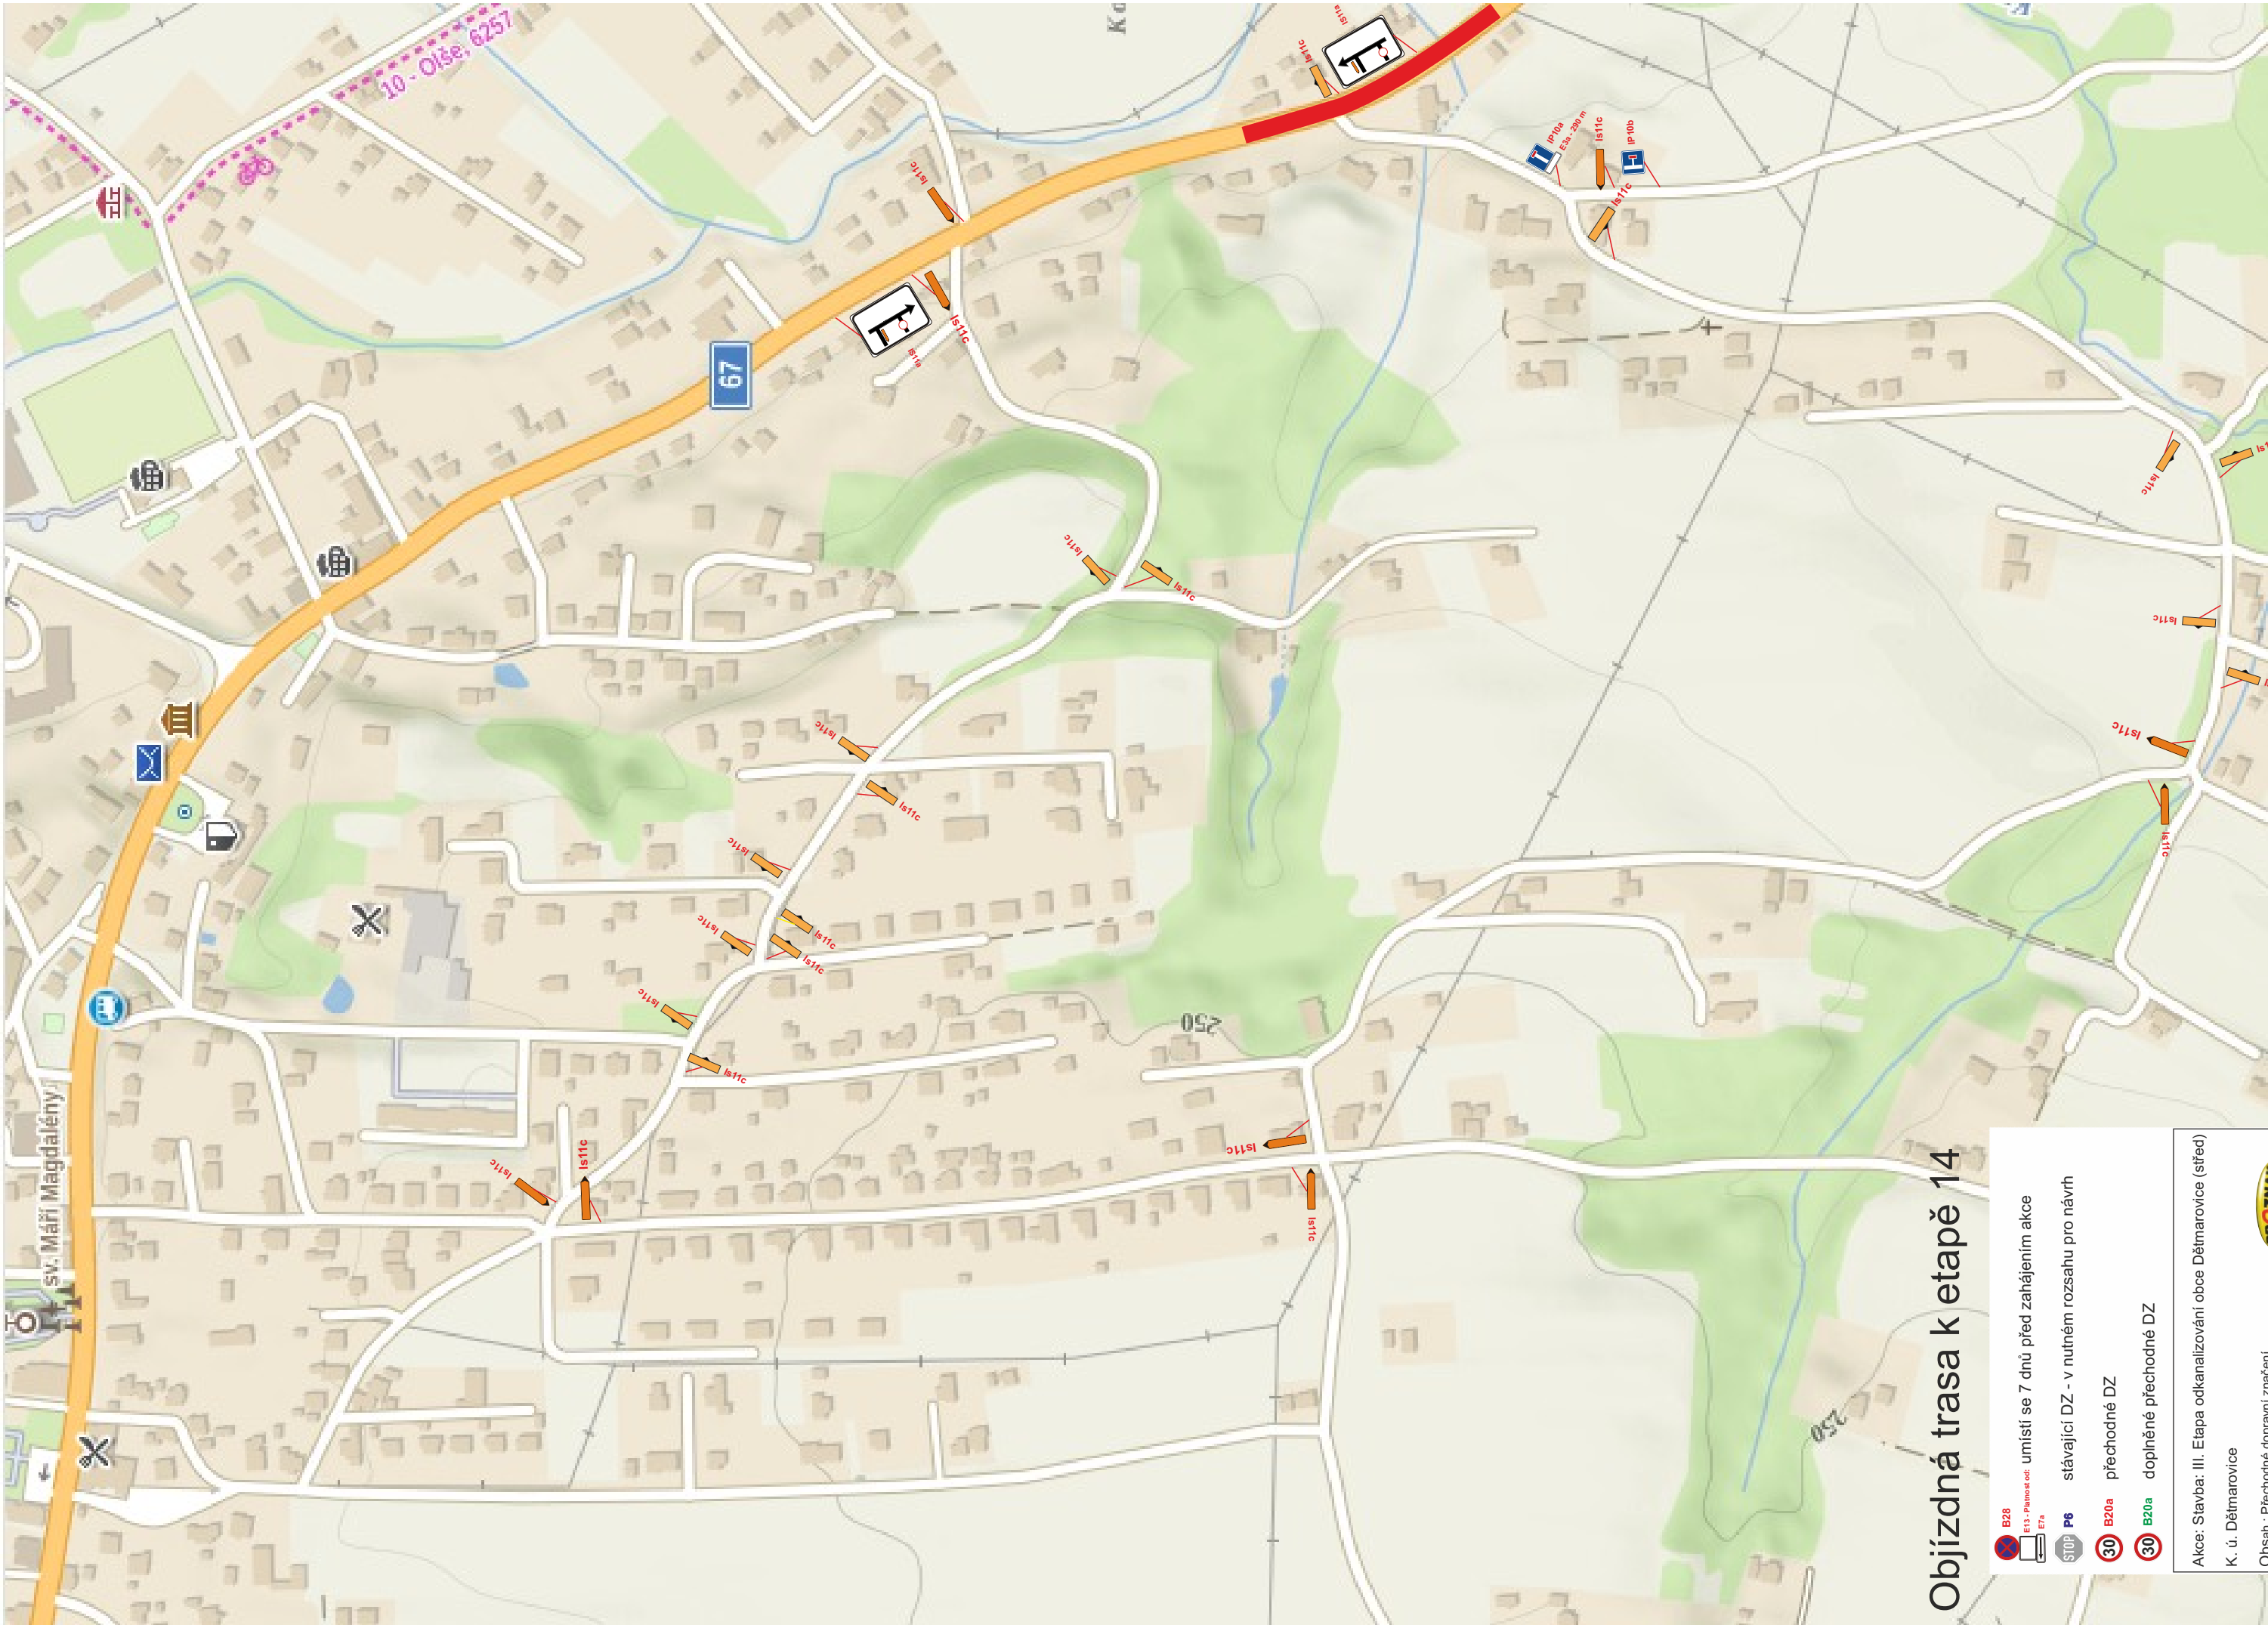

Objízdňá trasa k etapě 14

-  **B28**  **E13** - Plánost od: umístí se 7 dnů před zahájením akce
-  **P6** stávající DZ - v nutném rozsahu pro návrh
-  **B20a** přechodné DZ
-  **B20a** doplněné přechodné DZ

Akce: Stavba: III. Etapa odkanalizování obce Dětmárovice (střed)
K. ú. Dětmárovice
Obsah : Přechodné dopravní značení
Vpracoval: Ing. Tomáš Vladař



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: AEC56D9E15CB8E2F22D2E1FD12ACFAB69E4284D4D030072F0553B541D38CEC1C
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.3.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj
